

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 และ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และ สทอภ. นำรายงานต่อคณะกรรมการ สทอภ. โดยสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. และ รายงานผลการดำเนินงาน สรุป ดังนี้

1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ สทอภ.

ในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 “มติที่ 63/110 : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. รวมทั้งให้ใช้ Project Based Management เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรอย่างจริงจัง”

โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. (ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563) ได้แก่

(1) ขอให้ สทอภ. มุ่งเน้นการใช้ PBM ในการบริหารโครงการให้แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายจริงมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

(2) ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าการปรับตัวชี้วัด กพร อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID19 ว่า ก.พ.ร. ยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของ สทอภ. โดยจะพิจารณาพร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินว่า แม้จะไม่ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นตามที่ สทอภ. เสนอ คณะแนวตัวชี้วัด ก.พ.ร. โดยภาพรวมตามตัวชี้วัด พ.ศ. 2563 จะอยู่ในระดับดี (>80%)

(3) ในการกำหนดตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2564 ให้กำหนดตัวชี้วัดระดับ OUTCOME ที่เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ที่จะสามารถวัดได้จริงมาเป็นตัวกำหนด โดยเฉพาะผลลัพธ์จากโครงการ THEOS-2 ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ชัดเจน

(4) ให้ สทอภ. ศึกษารายละเอียดผลคะแนนตัวชี้วัด ITA ในแต่ละหัวข้อและระบุสาเหตุรวมถึงแนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณ 2564 มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

(5) ตัวชี้วัด อว. เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ SKP สทอภ. พิจารณาเฉพาะ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศรีราชา แต่ สทอภ. มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง COVID ซึ่งพัฒนาอยู่ ณ พื้นที่ศูนย์ราชการ ซึ่งผลลัพธ์ของระบบมีคุณค่า แต่ไม่สามารถนำมานับเป็นตัวชี้วัดได้ สทอภ. ต้องหาช่องทางในการสร้างการรับรู้กับหน่วยงานภายนอกด้วย นอกจากนี้ สทอภ. ควรเตรียมความพร้อม วิธีการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ COVID19 ที่อาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนาน จึงขอให้พิจารณารูปแบบการดำเนินงานภายใน และการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบ New normal


(6) ให้ สทอภ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือมปี ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ ได้กำหนดให้ส่วนราชการสามารถกักงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีได้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จแม้ว่าจะผูกพันสัญญาแล้ว ก็ต้องคืนงบประมาณไปยังกระทรวงการคลัง

2. ผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1) สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 2,123,344,775.98 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 836,580,972.57 บาท (ร้อยละ 39.40), ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,249,417,004.42 บาท (ร้อยละ 58.84), ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 3,745,550.82 บาท (ร้อยละ 0.18) และมีเงินเหลือจ่ายคืนกลับเป็นเงินสะสม สทอภ. ทั้งหมด 33,601,248.17 บาท (ร้อยละ 1.58)

(2) สำหรับรายการผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,249,417,004.42 บาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน และ รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 3,745,550.82 บาท ทั้งหมดเป็นโครงการเพื่อการหารายได้ของ สทอภ. ซึ่งทุกโครงการต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปัญหาอุปสรรค อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ

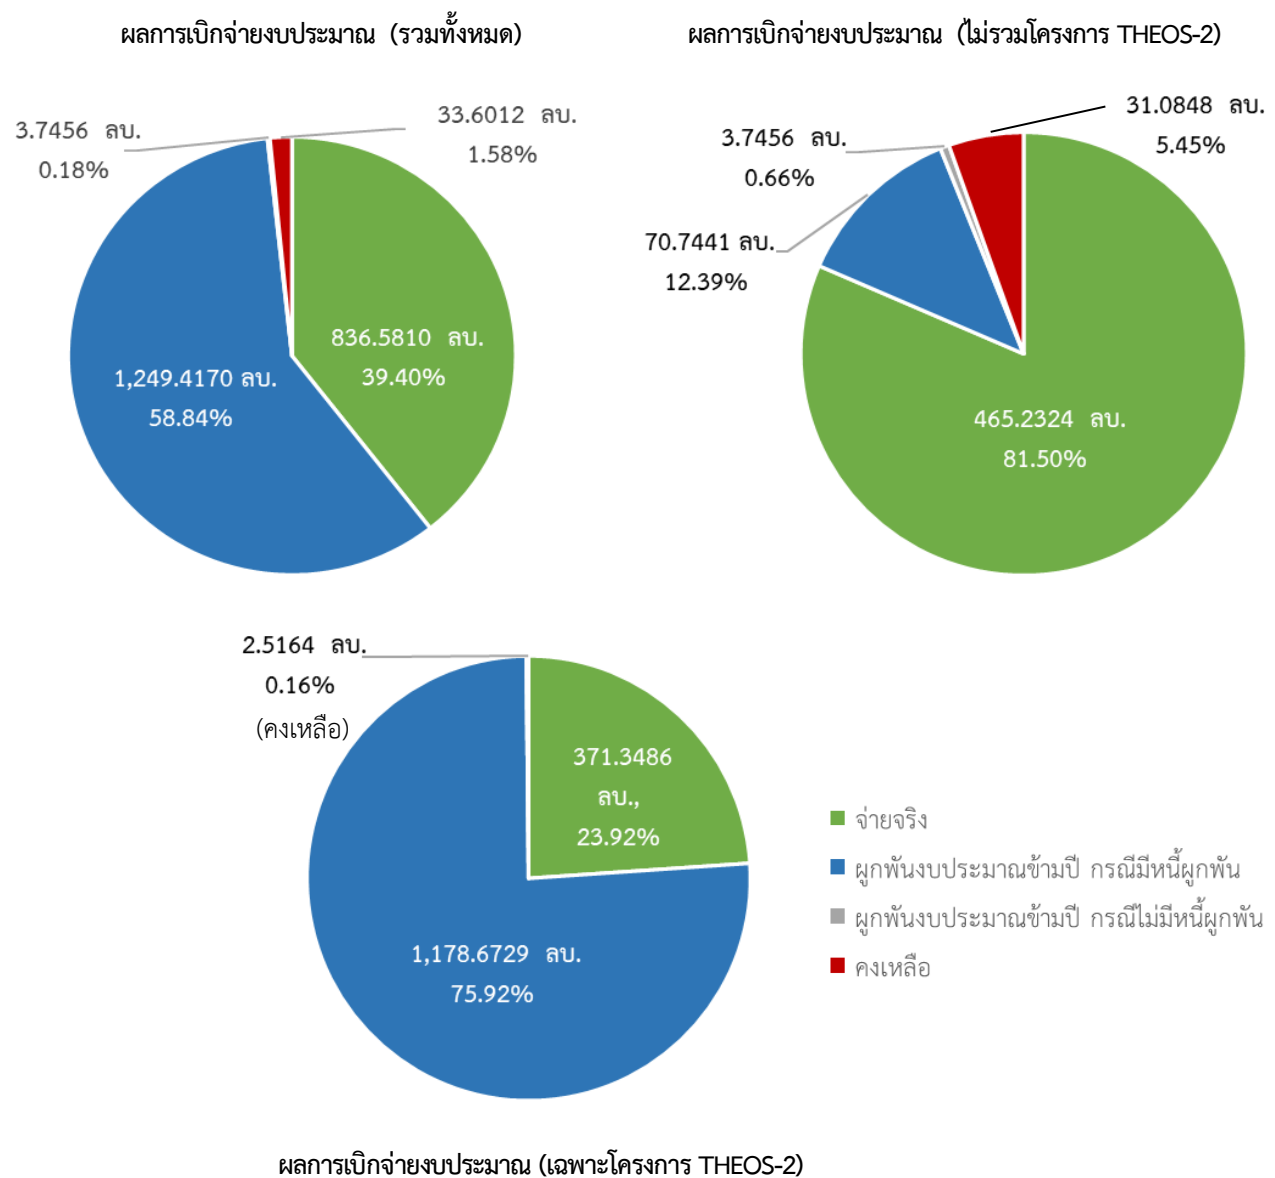

(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

แหล่งเงิน	งบประมาณจัดสรร	ยอดจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณข้ามปี		ยอดคงเหลือ
			กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,795,731,300.00	618,748,500.90	1,162,818,052.99	-	14,164,746.11
เงินรายได้	56,706,900.00	48,902,495.64	3,768,608.25	-	4,035,796.11
เงินกองทุนสวัสดิการ	14,210,900.00	12,943,945.44	-	-	1,266,954.56
เงินบริหารความเสี่ยง	7,119,122.87	4,043,874.00	749,000.00	-	2,326,248.87
เงินทุน สทอภ.	169,664,916.49	101,431,978.06	63,394,799.08	-	4,838,139.35
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	61,071,070.89	36,185,361.61	17,734,819.10	2,842,200.96	4,308,689.22
เงินรายได้ตามอำนาจ ผลทอภ.	4,378,880.95	3,595,016.88	-	204,793.88	579,070.19
เงินสำรองรายได้	14,361,684.78	10,711,960.54	951,725.00	698,555.98	1,999,443.26
เงินเครดิตภาษี	100,000.00	17,839.50	-	-	82,160.50
รวมทั้งหมด	2,123,344,775.98	836,580,972.57 ร้อยละ 39.40	1,249,417,004.42 ร้อยละ 58.84	3,745,550.82 ร้อยละ 0.18	33,601,248.17 ร้อยละ 1.58

(4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบประมาณจัดสรร	ยอดจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณข้ามปี		ยอดคงเหลือ
			กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	345,053,300.00	286,206,504.88	44,821,550.99	-	14,025,244.13
เงินรายได้	56,706,900.00	48,902,495.64	3,768,608.25	-	4,035,796.11
เงินกองทุนสวัสดิการ	14,210,900.00	12,943,945.44	-	-	1,266,954.56
เงินบริหารความเสี่ยง	2,564,522.87	1,522,994.00	749,000.00	-	292,528.87
เงินทุน สทอภ.	72,359,624.00	65,146,258.99	2,718,434.78	-	4,494,930.23
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	61,071,070.89	36,185,361.61	17,734,819.10	2,842,200.96	4,308,689.22
เงินรายได้ตามอำนาจ ผลทอภ.	4,378,880.95	3,595,016.88	-	204,793.88	579,070.19
เงินสำรองรายได้	14,361,684.78	10,711,960.54	951,725.00	698,555.98	1,999,443.26
เงินเครดิตภาษี	100,000.00	17,839.50	-	-	82,160.50
รวมทั้งหมด	570,806,883.49 ร้อยละ 26.88	465,232,377.48 ร้อยละ 81.50	70,744,138.12 ร้อยละ 12.39	3,745,550.82 ร้อยละ 0.66	31,084,817.07 ร้อยละ 5.45

(5) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)

แหล่งเงิน	งบประมาณจัดสรร	ยอดจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณข้ามปี		ยอดคงเหลือ
			กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.	1,450,678,000.00	332,541,996.02	1,117,996,502.00	-	139,501.98
เงินบริหารความเสี่ยง	4,554,600.00	2,520,880.00	-	-	2,033,720.00
เงินทุน สทอภ.	97,305,292.49	36,285,719.07	60,676,364.30	-	343,209.12
รวมทั้งหมด	1,552,537,892.49 ร้อยละ 73.12	371,348,595.09 ร้อยละ 23.92	1,178,672,866.30 ร้อยละ 75.92	-	2,516,431.10 ร้อยละ 0.16

2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สตอก. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 จำนวน 47 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 22 แผนงาน และ 25 โครงการ และมีโครงการเพื่อการหารายได้ จำนวน 8 โครงการ รวมทั้งหมด 55 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 1 สรุปดังนี้

ก. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณจัดสรร	ผลเงินจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณข้ามปี		เงินคงเหลือ
			กรณี มีหนี้ผูกพัน	กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน	
แผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 (47 แผนงาน/โครงการ)	2,046,590,826.56	788,667,116.75 (38.54%)	1,230,730,460.32 (60.14%)	-	27,193,249.49 (1.33%)
โครงการเพื่อการหา รายได้ (8 โครงการ)	76,753,949.42	47,913,855.82 (62.43%)	18,686,544.10 (24.35%)	3,745,550.82 (4.88%)	6,407,998.68 (8.35%)
รวมทั้งหมด	2,123,344,775.98	836,580,972.57 (39.40%)	1,249,417,004.42 (58.84%)	3,745,550.82 (0.18%)	33,601,248.17 (1.58%)

ข. ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

2.2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 แผนงาน/โครงการ


2.2.2 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จต้องผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวน 32 แผนงาน/โครงการ (92 รายการ) ประกอบด้วย

- แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2563 จำนวน 27 โครงการ (65 รายการ) ซึ่งต้องผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,230,730,460.32 บาท
- โครงการเพื่อการหารายได้ จำนวน 5 โครงการ (27 รายการ) ซึ่งต้องผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 18,686,544.10 บาท และ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 3,745,550.82 บาท

2.2.3 สาเหตุที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ



สาเหตุที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	จำนวนรายการ
1. เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR, มีการประชาพิจารณ์ TOR /การประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น	64
2. เนื่องจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR/จำเป็นต้องปรับเพิ่มงานให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ สตอก. จะได้รับ ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงาน/ขยายสัญญา/ปรับเพิ่มงบประมาณ	18
3. เนื่องจากเป็นการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาสัญญา ซึ่งไม่ตรงตามปีงบประมาณ	10
รวมทั้งหมด	92

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)

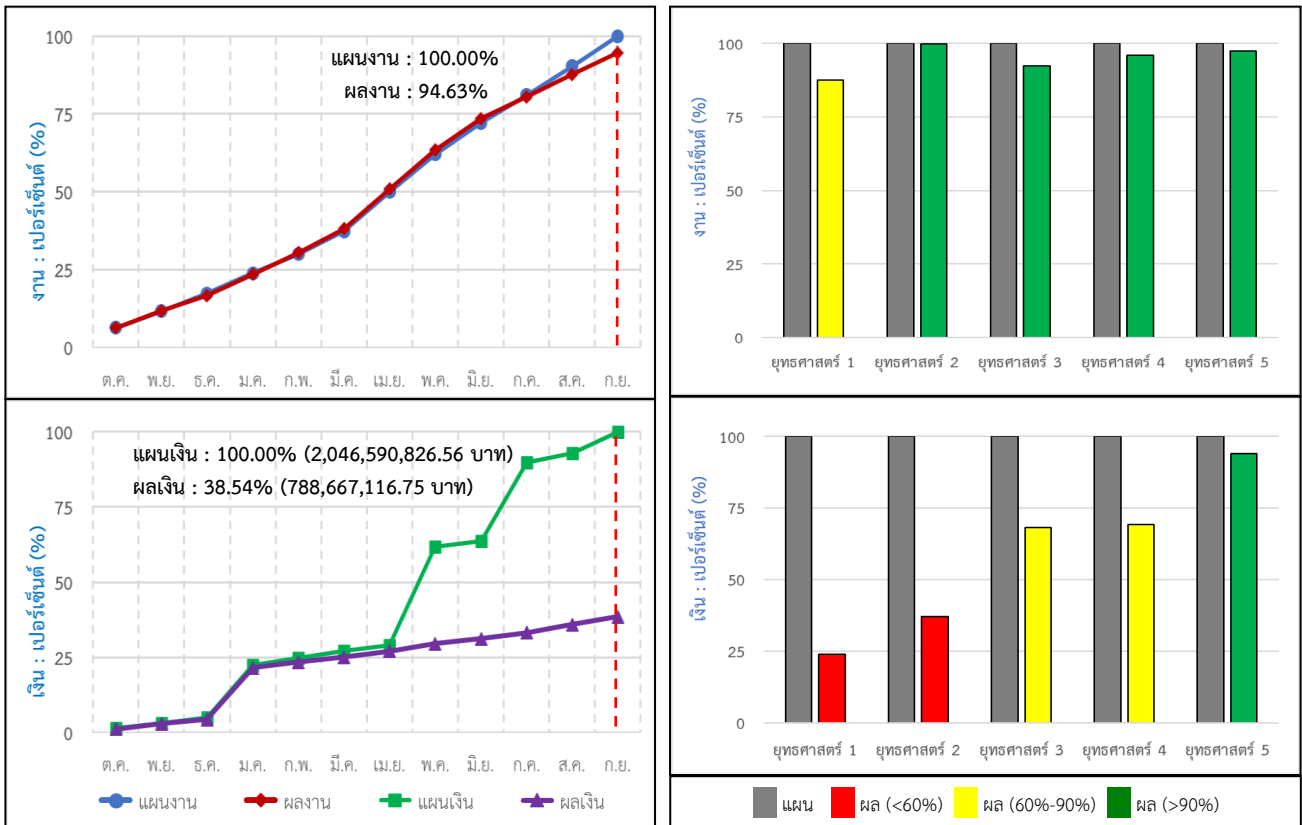

ยุทธศาสตร์ สทอภ.	จำนวนโครงการ/ แผนงาน	ผลการจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณ ข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	
					แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (1,557,536,633.49 บาท)	8	373,513,914.49 (23.98%)	1,181,197,866.30 (75.84%)	87.52	3	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (18,727,973.00 บาท)	4	6,955,304.72 (37.14%)	10,349,851.66 (55.26%)	99.84	3	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (82,973,901.06 บาท)	7	56,534,134.42 (68.13%)	20,354,773.60 (24.53%)	92.40	1	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (49,881,830.00 บาท)	10	34,541,492.55 (69.25%)	13,463,871.79 (26.99%)	95.90	5	5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (337,470,489.01 บาท)	18	317,122,270.57 (93.97%)	5,364,096.97 (1.59%)	97.51	8	10
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ (2,046,590,826.56 บาท)	47	788,667,116.75 (38.54%)	1,230,730,460.32 (60.14%)	94.63	20	27
โครงการเพื่อการหารายได้ (76,753,949.42 บาท)	8	47,913,855.82 (62.43%)	มีหนี้ 18,686,544.10 (24.35%) ไม่มีหนี้ 3,745,550.82 (4.88%)		3	5
รวมทั้งหมด (2,123,344,775.98 บาท)	55	836,580,972.57 (39.40%)	มีหนี้ 1,249,417,004.42 (58.84%) ไม่มีหนี้ 3,745,550.82 (0.18%)		23	32

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ผศทอภ.

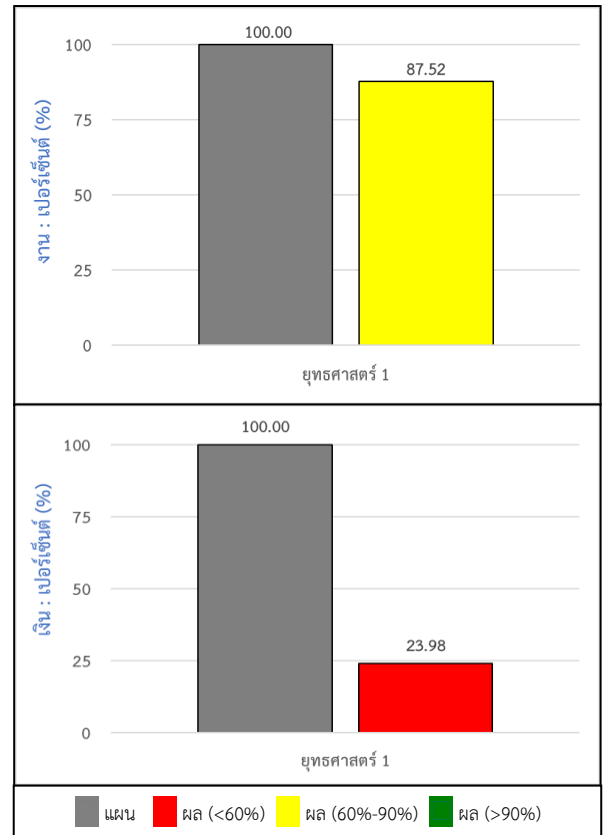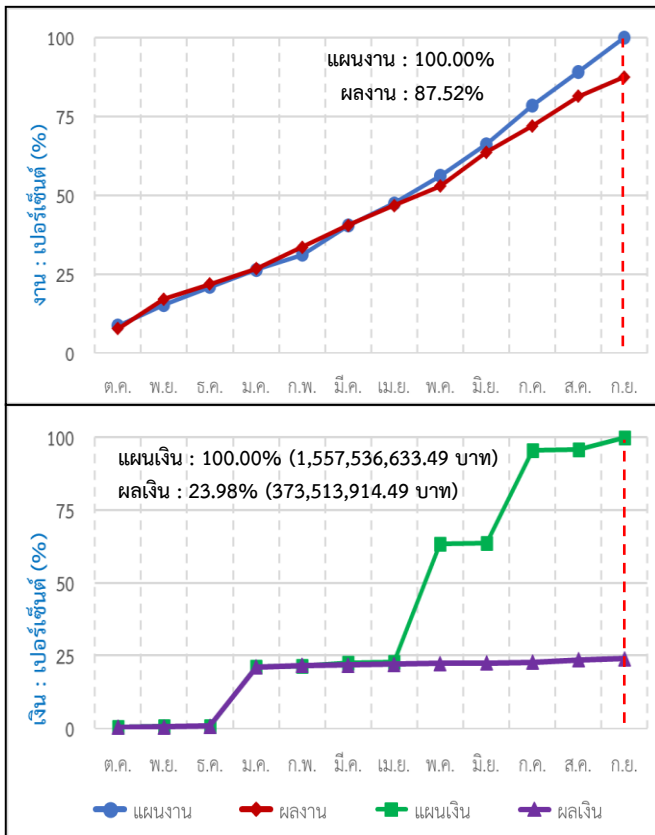

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 1,557,536,633.49 บาท โดยเบิกจ่ายจริง 373,513,914.49 บาท (ร้อยละ 23.98), ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,181,197,866.30 บาท (ร้อยละ 75.84) และคงเหลือ 2,824,852.70 บาท (ร้อยละ 0.18)

2. ผลการดำเนินงาน


ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ/แผนงาน				
1. 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ) (เงิน พ.ร.บ. 1,431.7200 ลบ.)	97.00	21.95 (314.28 ลบ.)	78.05 (1,117.44 ลบ.)	-
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี การพัฒนาดาวเทียมหลัก MS-8 Instrument AIT TEST Readiness Review (I-TRR) และ MS-9 Platform AIT TRR (P-TRR) and End of AIP Development and Implementation : Airbus ได้ดำเนินการในส่วนของ I-TRR และ P-TRR แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากการพัฒนาดาวเทียมหลัก MS 8 ในส่วนของ AIP ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มี การเบิกจ่ายในงวดงาน 8-9 คาดว่าจะเจรจาและเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกัณเงิน ใ้เบิกเหลือมปี	ร้อยละ คงเหลือ
2. 63021 - โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ) (75.2813 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 18.9580 ลบ. / เงินบริหารความเสี่ยง 4.5546 ลบ. / เงินทุน 51.7687 ลบ.)	99.85	70.21 (52.8543 ลบ.)	26.45 (19.9105 ลบ.)	3.34 (2.5164 ลบ.)
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกัณเงินใ้เบิกเหลือมปี 10 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ L3 (Datron) (วงเงินกัณเหลือมปี 3,120,000 บาท) เลขสัญญา 9/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 5,200,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 และ 4 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63 2. ค่าบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ VIASAT (วงเงินกัณเหลือมปี 2,137,500 บาท) เลขสัญญา 7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 4,750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 4 - 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ธ.ค. 63 3. จ้างเหมาพัฒนาระบบเทอร์มินอลส่งถ่ายภาพสำหรับผู้ใช้งานทางทหาร (Military User Terminal) เลขสัญญา 30/2563 ลว. 25 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,950,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 26 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1-3 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64 4. กิจกรรมการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (งานเพิ่ม) (วงเงินกัณเหลือมปี 7,655,024.73 บาท) บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม : (วงเงินกัณเหลือมปี 720,000 บาท) บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 6. จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 (วงเงินกัณเหลือมปี 2,480,000 บาท) เลขสัญญา 26/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,480,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 7. จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 (วงเงินกัณเหลือมปี 170,000 บาท) เลขสัญญา 130/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 170,000 บาท จำนวน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 8. จ้างเหมาพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสำหรับข้อมูลดาวเทียมโครงการ THEOS-2 (วงเงินกัณเหลือมปี 498,000 บาท) เลขสัญญา 94/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 498,000 บาท จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.พ. 64 9. จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน (Ground Intelligent Network System) (วงเงินกัณเหลือมปี 495,000 บาท) เลขสัญญา 99/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 495,000 บาท จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 9 ก.ค. 63 - 4 ก.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน 			

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
	งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.ค. 64 10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ (วงเงินกันเหลือในปี 640,000 บาท) เป็นค่ามัดจำที่พักเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปประเทศอังกฤษ จำนวน 8 คน จะมีการเบิกจ่าย เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับมามาประเทศไทย ในเดือน มี.ค. 64			
3. 63132 - โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (THEOS-2/ พรเทพ) (เงินทุน 45.5366 ลบ.)	80.00	9.25 (4.2143 ลบ.)	90.75 (41.3223 ลบ.)	-
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (วงเงินกันเหลือในปี 41,322,341.57 บาท) เลขที่สัญญา 5/2563 ลว.7 พ.ค. 63 วงในสัญญา 210,713,600 บาท จำนวน 15 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 7 พ.ค. 63 - 29 ต.ค. 64 : งานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการ สทอภ. อนุมัติแล้ว และต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดส่งเอกสารไป 1 ครั้งแล้ว แต่จำเป็นต้องแก้ไขเอกสารบางรายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารชี้แจงสำนักงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64			
4. 63010 - โครงการ AIP เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (AIP/ชลธิป) (0.9108 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4108 ลบ. / เงินรายได้ 0.5 ลบ.)	93.00	70.71 (0.6441 ลบ.)	24.70 (0.2250 ลบ.)	4.58 (0.0418 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (วงเงินกันเหลือในปี 225,000 บาท) เลขที่สัญญา 12/2563 ลว. 10 มี.ค. 63 วงเงินในสัญญา 750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 มี.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63			
5. 63129 - โครงการวิเคราะห์ภาคทศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างและหลังสถานการณ์ COVID - 19 เพื่อการพัฒนา AIP (AIP / ชลธิป) (เงิน พ.ร.บ. 2.4000 ลบ.)	38.00	-	95.83 (2.3000 ลบ.)	4.17 (0.1000 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (วงเงินกันเหลือในปี 2,300,000 บาท) : เลขที่สัญญา 23/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 2,300,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน ม.ค. 64			
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน				
6. 63065 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพื่อขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศ (AIP/ ปกรณ์) (เงินรายได้ 0.5000 ลบ.)	100.00	100.00 (0.5000 ลบ.)	-	-
7. 63026 - แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (สยศ./ ธีรวิธรรม) (เงิน พ.ร.บ. 0.1260 ลบ.)	100.00	48.81 (0.0615 ลบ.)	-	51.19 (0.0645 ลบ.)
8. 63061 - แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP (AIP / อัคราพร) (1.0619 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.7109 ลบ. / เงินทุน 0.3510 ลบ.)	100.00	90.38 (0.9597 ลบ.)	-	9.62 (0.1022 ลบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (4 โครงการ)

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์)

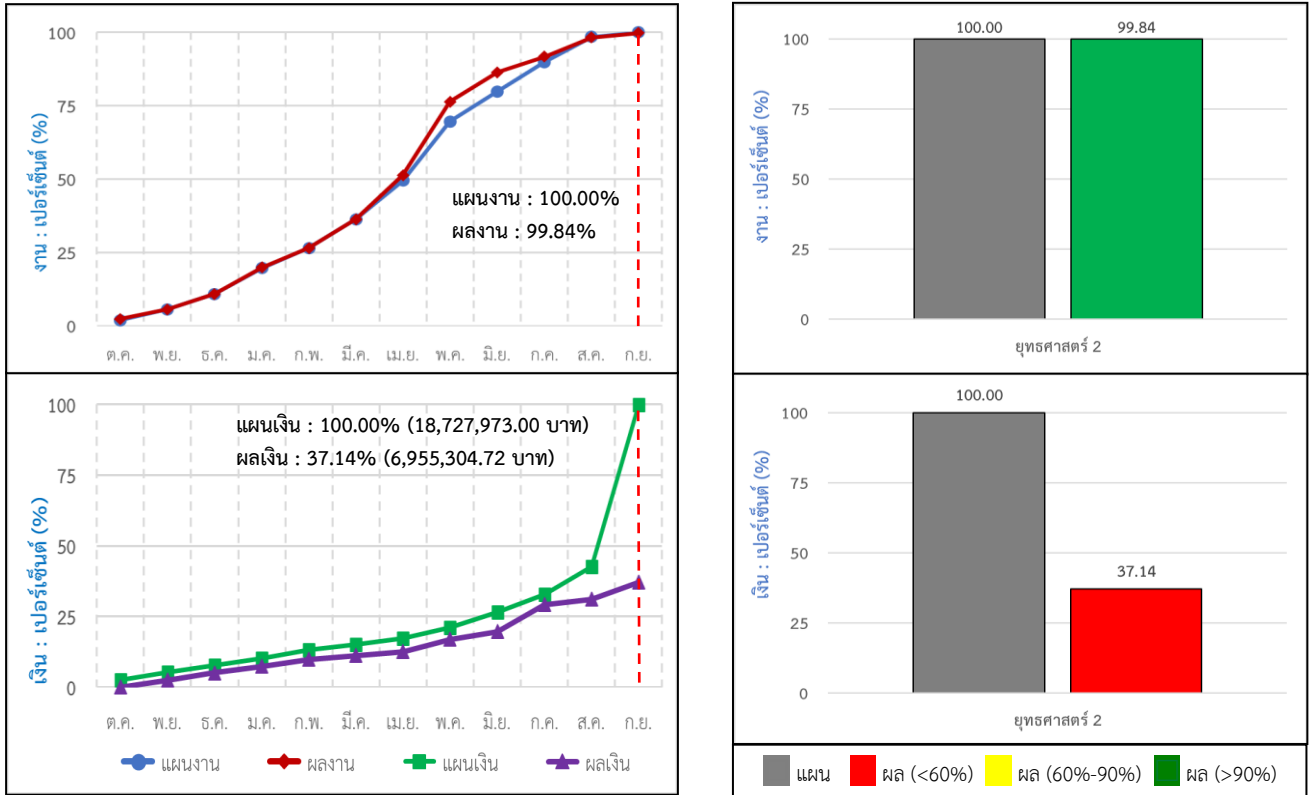

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ





ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 18,727,973.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 6,955,304.72 บาท (ร้อยละ 37.14) , ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 10,349,851.66 บาท (ร้อยละ 55.26) และ คงเหลือ 1,422,816.62 บาท (ร้อยละ 7.60)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน				
1. 63063 - โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace (สอร. (3C)/ อนุรักษ์วัฒน์) (14.5957 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 11.0773 ลบ. / เงินทุน 3.3166 ลบ. / เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 0.2017 ลบ.)	99.36	22.71 (3.3153 ลบ.)	70.91 (10.3499 ลบ.)	6.38 (0.9305 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและงบดำเนินการสนับสนุนภารกิจทดสอบดาวเทียมและอากาศยาน (10,050,000 บาท) เลขที่สัญญา สอร. 2/2563 ลว. 5 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 6 พ.ค. 63 - ธ.ค. 63 คาดว่าจะดำเนินงานและเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 (สุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 2. ค่าวัสดุเพื่อใช้สำหรับศูนย์ทดสอบ Aerospace (114,851.66 บาท) อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 3. จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ (185,000.00 บาท) เนื่องจากเงื่อนไขการสอบเทียบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าจะดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน				
2. 63013 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ อุทสาหกรรมฯ (สอ. (3C)/ ศิริพัทธร) (2.1106 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.07316 ลบ. / เงินทุน 0.03739 ลบ.)	100	85.68 (1.8084 ลบ.)	-	14.32 (0.3022 ลบ.)
3. 63124 - โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการภัยโควิด COVID 2019 เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลที่ร้องขอ (สอ. (3C)/ ศิริพัทธร) (เงิน พ.ร.บ. 1.8199 ลบ)	100	92.40 (1.6820 ลบ.)	-	7.60 (0.1383 ลบ.)
4. 63064 - โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำ ทางแม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สอ. (3C)/ ศิริพัทธร) (เงิน พ.ร.บ. 0.2019 ลบ)	100	74.34 (0.1501 ลบ.)	-	25.66 (0.0518 ลบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (7 โครงการ)
 ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)

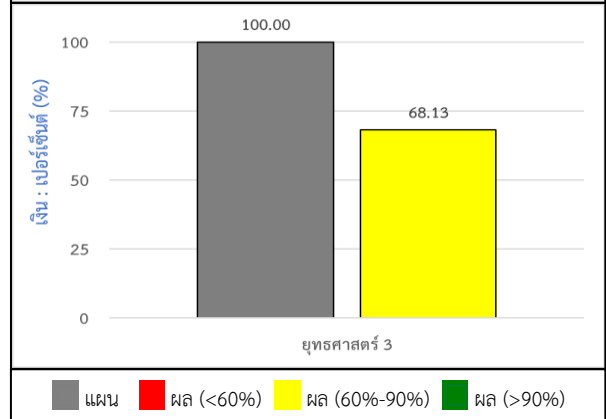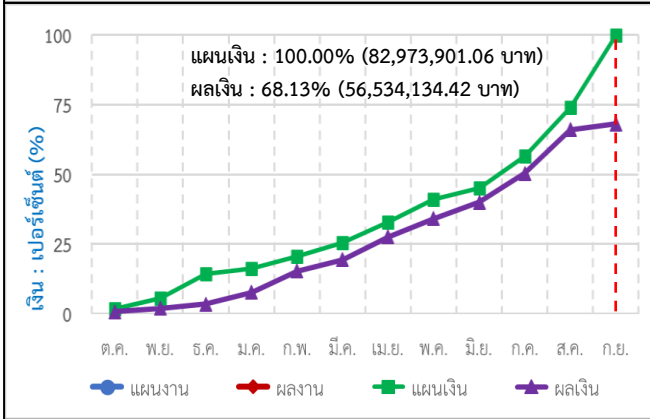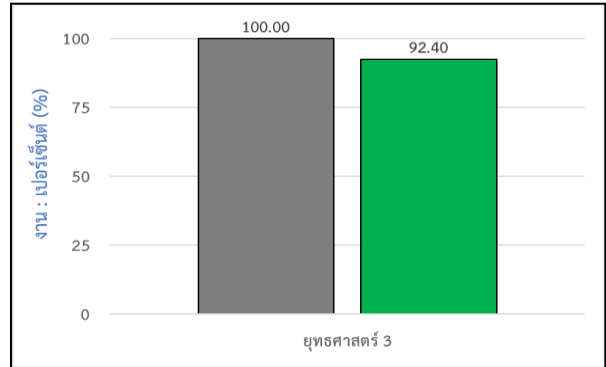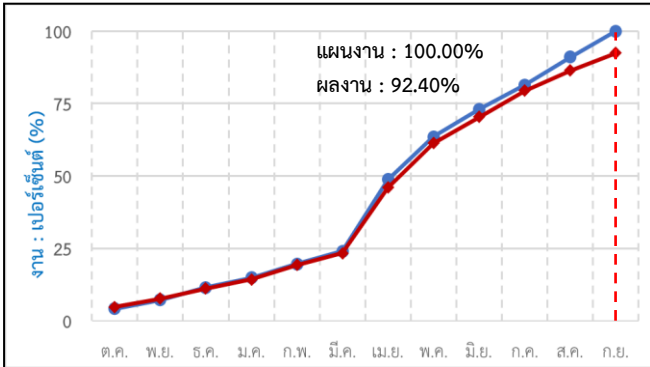

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 82,973,901.06 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 56,534,134.42 บาท (ร้อยละ 68.13) , ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 20,354,773.60 บาท (ร้อยละ 24.53) และ คงเหลือ 6,084,993.04 บาท (ร้อยละ 7.33)

2. ผลการดำเนินงาน


ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6 โครงการ/แผนงาน				
1. 63027- โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (สปลภ./ วราทิพย์) (เงิน พ.ร.บ. 2.9250 ลบ.)	97.60	64.36 (1.8825 ลบ.)	34.68 (1.0144 ลบ.)	0.96 (0.0281 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (700,000 บาท) เลขที่สัญญา 22/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1.4 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 16 มิ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 3 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 2. จ้างพัฒนาระบบประมวลผลการติดตามสภาพทางทะเลแบบกึ่งอัตโนมัติ (185,500 บาท) เลขที่สัญญา 97/2563 ลว. 1 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 0.265 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ซึ่งส่งมอบงานมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 3. ค่าวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (128,865.45 				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
	บาท) อยู่ระหว่างรอบบริษัทฯ ส่งของภายในวันที่ 7 พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในเดือน พ.ย. 63			
2. 63028 - โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลกจากอดีตผ่านปัจจุบันสู่นาคต (สปภ./ปิยวรรณ) (2.8434 ลบ. ได้แก่ เงินทุน 2.8429 ลบ. / เงินรายได้ตามอำนาจ ผลทอก. 0.00045 ลบ.)	93.00	70.89 (2.0157 ลบ.)	5.42 (0.1541 ลบ.)	23.69 (0.6735 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พิมพ์หนังสือสุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive summary : Suvarnabhumi Terra Incognita) (154,080 บาท) เลขที่สัญญา 129/2563 ลว. 17 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 154,080 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ก.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างอาร์ตเวิร์ก ครั้งที่ 1 คาดว่าจัดพิมพ์และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63				
3. 63035 - โครงการครบรอบ สทอก. 20 ปี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน (กพล./ กมลมาศ) (1.34 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.009 ลบ. / เงินรายได้ 1.25 ลบ.)	75.00	6.70 (0.0897 ลบ.)	93.16 (1.2483 ลบ.)	0.15 (0.0020 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. จ้างผลิตสบู่อุปโภค 20 ปี สทอก. (598,000 บาท) เลขที่สัญญา 28/2563 ลว. 27 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 598,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค. - 25 พ.ย. 63 : บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำร่างสบู่อุปโภค คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 2. จ้างจัดทำหนังสือกาลานุกรม (650,280 บาท) : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ. 64				
4. 63044 - แผนงานการสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม (สปภ./สผภ./กภค./ กพล. /ตติยะ) (59.0794 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 37.9055 ลบ. / เงินทุน 20.5316 ลบ. / เงินรายได้ตามอำนาจ ผลทอก. 0.6422 ลบ.)	87.40	63.53 (37.5350 ลบ.)	27.74 (16.9784 ลบ.)	7.73 (4.5659 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 13 กิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าธรรมเนียมรับสัญญาดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ (6,860,610 บาท) เลขที่สัญญา กพล802/2563 ลว.7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 6,860,610 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : ลงนามล่าช้าเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้บริษัท e.GEOS S.p.A. ไม่สามารถส่งเอกสารต้นฉบับซึ่งออกโดยสถานทูตและเอกสารต้นฉบับของบริษัทมาให้คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาได้ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายใน ก.พ. 64 2. เช่าคลาวด์ และ Colocation (3,314,325 บาท) เลขที่สัญญา 7/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 4,419,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 มิ.ย. 63 - 27 ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ก.พ. 64 3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA) (1,500,000 บาท) เลขที่สัญญา 18/2563 ลว. 12 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 3,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 13 พ.ค. 63 - 8 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 4. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank (MA) (395,000 บาท) เลขที่สัญญา 21/2563 ลว.25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 790,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 5. รักษาความต่อเนื่องระบบเรดาร์ชายฝั่ง (460,800 บาท) เลขที่สัญญา				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกัณเงิน ใ้เบิกเหลือมปี	ร้อยละ คงเหลือ
	<p>17/2563 ลว. 23 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,152,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 24 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ 6 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ต.ค. 63</p> <p>6. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ (MA) (495,000 บาท) เลขที่สัญญา 20/2563 ลว. 25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 990,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63</p> <p>7. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage (118,500 บาท) เลขที่สัญญา 88/2563 ลว. 6 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 237,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 7 พ.ค. - 3 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63</p> <p>8. จ้างเหมาเช่าใช้บริการ Google Apls (99,889.01 บาท) เลขที่สัญญา 11/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 150,000 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 18 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างการเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ธ.ค. 63</p> <p>9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed (2,457,375.65 บาท) เลขที่สัญญา Contract No.16/2020 ลว. 7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,457,375.65 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64</p> <p>10. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง (206,666 บาท) เลขที่สัญญา สอร.12/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 วงเงิน ในสัญญา 516,665 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิ.ย. - 8 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63</p> <p>11. ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (550,000 บาท) เลขที่สัญญา 25/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 550,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 11 พ.ย. 63 คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63</p> <p>12. ค่าจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (301,466.51 บาท) : อยู่ระหว่างการจัดหา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย ได้ภายในเดือน ม.ค. 64</p> <p>13. จ้างจัดหาและทำสื่อประชาสัมพันธ์ (218,804.30 บาท) เลขที่สัญญา 117/2563 ลว. 25 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 218,804.30 บาท ระยะเวลา ดำเนินการ 26 ส.ค. - 26 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างจัดหาและจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63</p>			
<p>5. 63050 - แผนงานจัดหาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ เป็นพื้นฐานของระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา พื้นที่อย่างยั่งยืน (สปภ./ ชินตา) (เงินทุน 10.3862 ลบ.)</p>	<p>97.80</p>	<p>90.47 (9.3967 ลบ.)</p>	<p>7.07 (0.7346 ลบ.)</p>	<p>2.45 (0.2549 ลบ.)</p>
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกัณเงินใ้เบิกเหลือมปี</p> <p>ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง (734,611.68 บาท) การส่งถ่าย ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังไม่สามารถบันทึกภาพที่ปลอดภัยได้ คาดว่า จะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64</p>			

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกัณเงิน ใ้เบิกเหลือมปี	ร้อยละ คงเหลือ
6. 63131 - โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (สผภ. / ยรรยง) (เงิน พ.ร.บ. 3 ลบ.)	96.00	91.33 (2.7400 ลบ.)	7.50 (0.2250 ลบ.)	1.17 (0.0350 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกัณเงินใ้เบิกเหลือมปี จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล (225,000) เลขที่ สัญญา 92/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 300,000 บาท จำนวน 12 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 : อยู่ระหว่าง ดำเนินตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือน ก.ค. 64				
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน				
7. 63128 - โครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น จากการขาดน้ำเพื่อการ บริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี และ อุบลราชธานี (สภภ./ ศิริลักษณ์) (เงิน พ.ร.บ. 3.4000 ลบ.)	100	84.54 (2.8745 ลบ.)	-	15.46 (0.5255 ลบ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ)
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.อสมว. (ดำรงค์ฤทธิ์)

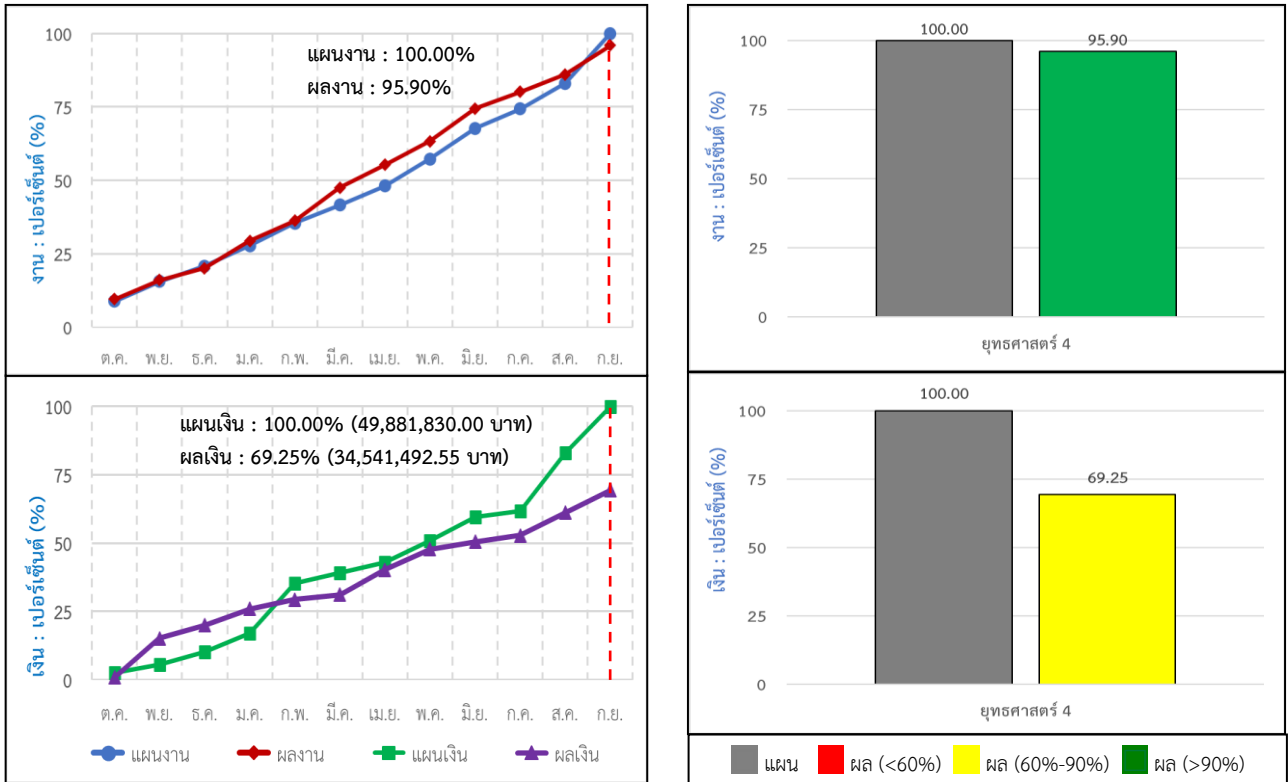

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 10 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 49,881,830.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 34,541,492.55 บาท (ร้อยละ 69.25) , ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 13,463,871.79 บาท (ร้อยละ 26.99) และคงเหลือ 1,876,465.66 บาท (ร้อยละ 3.76)

2. ผลการดำเนินงาน



ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5 โครงการ/แผนงาน				
1. 63057 - โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 (สวท./ ศุภัชชา) (7.7236 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 3.4570 ลบ. /เงินทุน 4.2666 ลบ.)	85.60	66.01 (5.0982 ลบ.)	26.99 (2.0845 ลบ.)	7.00 (0.5408 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1. จ้างเหมาสำรวจจัดทำข้อมูลสนามบินและการสำรวจภาคพื้น (1,984,500 บาท) เลขที่สัญญา สอ.ร.15/2563 ลว.4 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,205,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 : ลำบากเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ก.พ. 64</p> <p>2. วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา (100,000 บาท) เลขที่สัญญา สอ.ร. 21/2563 ลว.30 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. -30 พ.ย. 63 : อยู่ดำเนินการจัดหาหนังสือคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 63</p>				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
2. 63008 - โครงการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอวกาศ (Space Frontier Research) (สวภ./ ดำรงศักดิ์) (15.7702 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 10.9348 ลบ. / เงินทุน 4.8354 ลบ.)	78.08	31.72 (5.0026 ลบ.)	67.89 (10.7067 ลบ.)	0.39 (0.0608 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1. ชื่อครุภัณฑ์สำหรับการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรับการพัฒนา liquid crystal ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (Space EX) (10,400,000 บาท) เลขที่สัญญา สอธ.3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 10,400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 64 : ล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ม.ค. 64</p> <p>2. จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ (306,721.79 บาท) เลขที่สัญญา สอธ.6/2563 ลว.24 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 3,800,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 25 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตาม TOR ได้และขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ งวดที่ 4 ออกไปอีก 282 วัน (ขยายจนถึง ก.ค. 64)</p>				
3. 63062 - โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต (สพอ./ จันทิมา) (เงินรายได้ 1.7990 ลบ.)	100	86.48 (1.5559 ลบ.)	8.89 (0.1600 ลบ.)	4.62 (0.0831 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>ค่าจ้างเหมาการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้แบบหมุนเวียน (160,000 บาท) เลขที่สัญญา สอธ.1279/2563 ลว.18 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 : ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>				
4. 63011 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (สอธ. (3C)/ ศิริพัทธ์) (6.8009 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 5.4439 ลบ. / เงินรายได้ 2.7363 ลบ. / เงินทุน 0.4694 ลบ. / เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 0.1513 ลบ.)	97.60	95.01 (8.3615 ลบ.)	4.92 (0.4327 ลบ.)	0.08 (0.0068 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1. จ้างเหมาระบบจำหน่ายตั๋ว เครื่องกันน้บคน (234,700 บาท) : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p> <p>2. ซ่อมบำรุงเครื่องเล่น นิทรรศการโซนที่ 17 Google Street View (176,550 บาท) : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p> <p>3. จัดจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ และซ่อมแซมอุปกรณ์โซนนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา (21,400 บาท) : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>				
5. 63032 - แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร เพื่อสร้างบุคลากรฯ (สพอ./ ปรานปรียา) (12.4022 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 9.014 ลบ. / เงินทุน 3.3882 ลบ.)	97.75	92.13 (11.4268 ลบ.)	0.65 (0.08 ลบ.)	7.22 (0.8954 ลบ.)
<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Dr.Haoran Zhang) งวดที่ 3 (80,000 บาท) เลขที่สัญญา สอธ.1348/2563 ลว.18 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 80,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกัณเงิน ใ้เบิกเหลือมปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ/แผนงาน				
6. 63054 - โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิ สารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน : G-Rice (สวภ./ ธนากร) (เงินทุน 1.0600 ลบ.)	100	88.93 (0.9427 ลบ.)	-	11.07 (0.1173 ลบ.)
7. 63055 - โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการพระราชดำริ : GMIS (สวภ./ ธนากร) (0.8087 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.2007 ลบ. / เงินทุน 0.608 ลบ.)	100	96.87 (0.7834 ลบ.)	-	3.13 (0.0253 ลบ.)
8. 63005 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวภ./ อัญชนก) (เงิน พ.ร.บ. 0.7682 ลบ.)	100	93.92 (0.7215 ลบ.)	-	6.08 (0.04670 ลบ.)
9. 63067 - โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขต นวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระยะที่ 1 (สวภ./ ณัฐวัฒน์) (เงิน พ.ร.บ. 0.2991 ลบ.)	100	66.55 (0.1990 ลบ.)	-	33.45 (0.1000 ลบ.)
10. 63125 - โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ โลกสู้ โรค สู้ภัย COVID-19 ด้วยการจัดการเชิงพื้นที่แบบ องค์กรร่วม (สพอ. / จันทิมา) (เงิน พ.ร.บ. 0.4500 ลบ.)	100	100 (0.4500 ลบ.)	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (18 โครงการ)

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ : รอง ผสทอภ. (พีร์)

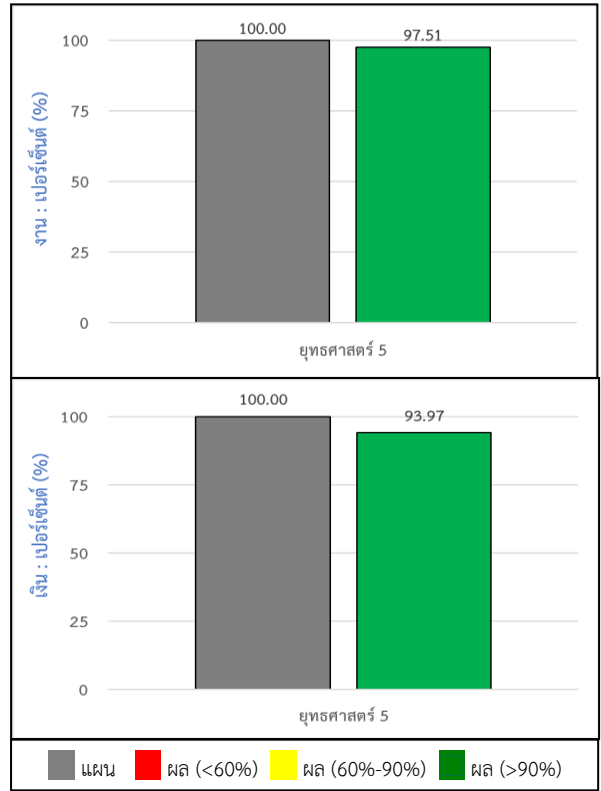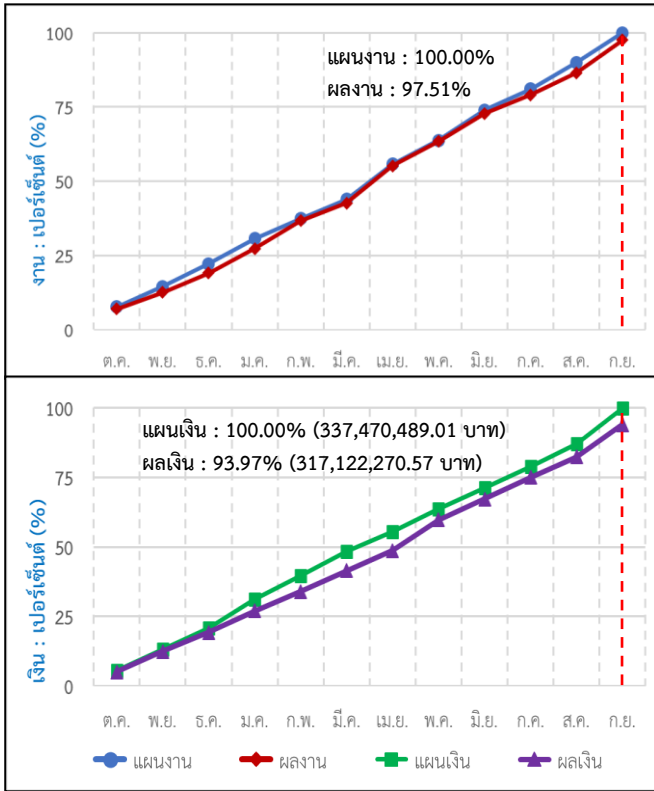

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 18 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 337,470,489.01 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 317,122,270.57 บาท (ร้อยละ 93.97) , ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 5,364,096.97บาท (ร้อยละ 1.59) และคงเหลือ 14,984,121.47 บาท (ร้อยละ 4.44)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 10 โครงการ/แผนงาน				
1. 63049 - แผนงานพื้นฐานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอธ.3S/วรรณวีร์) (45.9615 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 28.53 ลบ./เงินรายได้ 12.6234 ลบ. /เงินความเสี่ยง 2.2583 ลบ. / เงินทุน 0.932 ลบ. /เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 1.6179 ลบ.)	99.80	95.64 (43.9558 ลบ.)	1.63 (0.749 ลบ.)	2.73 (1.2567 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลาดฟ้าและผนังอาคาร SI) (749,000 บาท) เลขที่สัญญา สอธ.17/2563 ลว.20 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 749,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ส.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63				
2. 63015 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท./ ปฐมพงศ์) (23.7121 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.1199 ลบ. /เงินรายได้ 23.5569 ลบ. /เงินความเสี่ยง 0.0353)	96.27	92.80 (22.0056 ลบ.)	3.60 (0.8529 ลบ.)	3.60 (0.8536 ลบ.)
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (316,800 บาท) เลขที่สัญญา 5/2563 ลว. 29 พ.ย. 62 วงเงินในสัญญา 792,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
2. ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส (465,450 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63				
3. การจดทะเบียน AS Number ในนามของ สทอภ (70,620 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63				
3. 63024 - แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท./ สุกัญญา) (5.1477 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 4.7462 ลบ. / เงินความเสี่ยง 0.09496 ลบ. / รายได้อำนาจ ผส. 0.2690 ลบ.)	98.00	97.06 (4.9964 ลบ.)	0.66 (0.0341 ลบ.)	2.28 (0.1172 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี คำวิสุดสำนักงาน ในการจัดทำสายคล้องบัตรพร้อมคลิปแบบตลับสาย ยืด (โยโย่) และซองหนังสำหรับบุคลากร สทอภ. (34,133 บาท) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63			
4. 63020 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท./ มาลิน) (7.0764 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 6.9324 ลบ. / เงินรายได้ 0.1010 ลบ. / เงินกองทุนสวัสดิการ 0.020 ลบ. / เงินความเสี่ยง 0.023 ลบ.)	100	92.69 (6.5592 ลบ.)	1.98 (0.1402 ลบ.)	5.33 (0.3770 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) (90,040.50 บาท) เลขที่สัญญา 113/2563 ลว. 28 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 90,040.50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 ส.ค. - 12 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (50,204.40 บาท) เลขที่สัญญา 6/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 50,204.40 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63			
5. 63023 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบท./ พนิดา) (217.4228 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 189.8147 ลบ. / เงินรายได้ 7.3384 ลบ. / กองทุนสวัสดิการ 14.1534 ลบ. / เงินทุน 5.9962 ลบ. / เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.0201 / เงินเครดิตภาษี 0.1 ลบ.)	100	98.69 (214.5666 ลบ.)	0.29 (0.6268 ลบ.)	1.03 (2.2294 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบัญชี (600,000 บาท) เลขที่สัญญา 19/2563 ลว. 7 พ.ค 63 วงเงินในสัญญา 600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 13 พ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 64 2. จัดจ้างตรวจสอบรายงานสถานภาพเงินรายได้และเงินทุน สำหรับรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (26,750 บาท) เลขที่สัญญา 63/2563 ลว. 14 ก.พ. 63 วงเงินในสัญญา 107,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 ก.พ. - 31 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63			
6. 63030 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./ สรทัศน์) (3.0553 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.0786 ลบ. / เงินรายได้ 1.9767 ลบ.)	100	48.08 (1.4689 ลบ.)	47.69 (1.4572 ลบ.)	4.23 (0.1292 ลบ.)
	กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน NGT (449,000 บาท) เลขที่สัญญา 91/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 449,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 มิ.ย. 63 - พ.ย. 63 (150 วัน) : บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 2. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตรายงานประจำปี (350,000 บาท) เลขที่สัญญา 90/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 350,000 บาท			

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ คงเหลือ
	<p>ระยะเวลาดำเนินการ 22 พ.ค. - พ.ย. 63 (180 วัน) : บริษัทอยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจปฏิรูป คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63</p> <p>3. จัดทำข้อมูลบทบาทและภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นองค์กร (347,750 บาท) เลขที่สัญญา 100/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 347,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับถัดจากตรวจปฏิรูป : อยู่ระหว่างให้บริษัทปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ม.ค. 64</p> <p>4. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ rebrand (265,500 บาท) เลขที่สัญญา 29/2563 ลว.9 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 295,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63</p> <p>5. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร (44,940 บาท) เลขที่สัญญา 15/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 269,640 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63</p>			
7. 63004 - โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม (สยศ./ วรรณัฐ) (เงินรายได้ 1.1000 ลบ.)	90.55	29.59 (0.3255 ลบ.)	69.05 (0.7595 ลบ.)	1.36 (0.015 ลบ.)
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562 (759,500 บาท) เลขที่สัญญา 16/2563 ลว. 3 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,085,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาปรับปรุงรายงานชิ้นกลาง (งวดงานที่ 2 จาก 3 งวดงาน) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63</p>			
8. 63009 - แผนงานบริหารงาน สนับสนุน และกำกับ THEOS-2 (CEO Team / เวียร์เธียร์) (6.1183 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.3698 ลบ./เงินรายได้ 2.2485 ลบ. /เงินทุน 1.5 ลบ.)	100	58.76 (3.5952 ลบ.)	0.03 (0.0016 ลบ.)	41.21 (2.5215 ลบ.)
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กลุ่มภารกิจพิเศษสนับสนุนโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (1,620 บาท) : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>			
9. 63126 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (CEO Team / จุฑามาศ) (เงินรายได้ 0.084 ลบ.)	75.00	16.82 (0.0141 ลบ.)	5.02 (0.0042 ลบ.)	78.16 (0.0657 ลบ.)
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>ค่ารับรองและพิธีการ ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิสารสนเทศ : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>			
10. 63075 - โครงการเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด (สยศ. / แพรวพร) (พ.ร.บ. 4.6265 ลบ.)	100	1.30 (0.0599 ลบ.)	15.96 (0.7386 ลบ.)	82.74 (3.8280 ลบ.)
	<p>กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี</p> <p>ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโซนนิทรรศการ Space Inspirium และวัสดุภายใน SI เพื่อใช้ในภารกิจเตรียมต้อนรับคณะ รมว.อว. : ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63</p>			

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ ผลงาน	ร้อยละ ผลจ่ายจริง	ร้อยละกัณเงิน ไว้เบิกเหลือมปี	ร้อยละ คงเหลือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ/แผนงาน				
11. 63052 - แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท./ สุธศักดิ์) (1.1560 ลบ. ได้แก่ เงินพ.ร.บ. 1.0179 ลบ. /เงินรายได้ 0.1380 ลบ.)	100	89.31 (1.0324 ลบ.)	-	10.69 (0.1236 ลบ.)
12. 63016 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส./ เศรษฐา) (เงิน พ.ร.บ. 0.2405 ลบ.)	100	40.64 (0.0977 ลบ.)	-	59.36 (0.1428 ลบ.)
13. 63003 - แผนงานบริหารและการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ (สยศ./ ระวีวรรณ) (3.8883 ลบ. ได้แก่เงิน พ.ร.บ. 3.7353 ลบ. /เงินความเสี่ยง 0.153 ลบ.)	100	85.55 (3.3266 ลบ.)	-	14.45 (0.5617 ลบ.)
14. 63022 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. / ศิญา ภัทร์) (0.6614 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4512 ลบ. /เงินทุน 0.2102 ลบ.)	100	40.20 (0.2659 ลบ.)	-	59.80 (0.3955 ลบ.)
15. 63006 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของ คณะกรรมการบริหาร (ผลค./ ณัฐนันท์) (4.1560 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 3.7855 ลบ. /เงินรายได้ 0.2205 ลบ. /เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.15 ลบ.)	100	61.41 (2.5520 ลบ.)	-	38.59 (1.6040 ลบ.)
16. 63017 - แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผส ทอภ. (CEO Team / ปารมี) (1.6037 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.2565 ลบ. /เงินรายได้ 1.3422 ลบ. //เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.005 ลบ.)	100	55.27 (0.8864 ลบ.)	-	44.73 (0.7173 ลบ.)
17. 63068 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ (สบท. / ปฐมพงศ์) (เงินทุน 11.3781 ลบ.)	100	100 (11.3781 ลบ.)	-	-
18. 63127 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ สังคม(สยศ. / สรทัศน์) (เงินรายได้ 0.0818 ลบ.)	100	43.70 (0.0358 ลบ.)	-	56.30 (0.460 ลบ.)

2.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

2.3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)

สทอภ. มีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมดจำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดโดยความเห็นชอบจาก รมว.อว. 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดจากการเจรจา 15 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (1) อยู่ระหว่างเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด (2) อยู่ระหว่างการพิจารณาขอยกเว้นตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด (3) น้อยกว่าขั้นต่ำ 1 ตัวชี้วัด (4) ขึ้นมาตรฐาน 2 ตัวชี้วัด และ (5) ขึ้นสูง 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 2 สรุปดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) รอกการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ.ร. (NA)	4	<p>ก. อยู่ระหว่างส่งเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่</p> <p>ตัวชี้วัด 1.5.2 (2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้งานระบบ Application/Solution ที่จัดหาภายใต้โครงการฯ (หน้าหลัก 1) <i>ปรับเป้าหมายและวิธีการวัด</i></p> <p>ตัวชี้วัด 1.5.2 (4) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน (Module) (หน้าหลัก 1) <i>ปรับวิธีการวัด</i></p> <p>ตัวชี้วัด 3.2.3 ความสำเร็จในการให้บริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (นวัตกรรม) (หน้าหลัก 10) <i>ปรับเป้าหมาย</i></p> <p>ข. ขอยกเว้นตัวชี้วัด (สำนักงาน ก.พ.ร. ไทองค์กรมหาชนที่มี ค่าใช้จ่ายตามบุคลากรเกินกว่า กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายตามบุคลากรฯ ให้มีหนังสือ เสนอ กพม. พิจารณา โดยจะ ต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่าย ตามบุคลากร เป็นเวลา 3 ป หาก กพม. เห็นชอบ ไม่คิดตัวชี้วัดนี้)</p> <p>ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) (หน้าหลัก 5) โดยมีหนังสือแจ้งขอยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สทอภ. ประจำปี 2563 หนังสือเลขที่ อว5308/1924 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563</p>
2) น้อยกว่าขั้นต่ำ	1	<p>ประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (WCY2020) ประกาศผลแล้วได้อันดับที่ 39</p>
3) ขึ้น ต่ำ 5 0 คะแนน	-	-
4) มาตรฐาน 75 คะแนน	2	<p>ตัวชี้วัด 1.5.1 การสรรหาคน (THEOS-2 Roadmap)</p> <p>ตัวชี้วัด 1.5.2 (3) การเตรียมความพร้อมบุคลากร ด้าน Application/Solutions และด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) (หน้าหลัก 1)</p>
5) ขึ้น สูง 1 0 0 คะแนน	13	<p>ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนหน่วยงานที่นำภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ระดับประเทศ (หน้าหลัก 10)</p> <p>ตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการนำข้อมูลไฟฟ้าและมลพิษทางอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ (MOU) (หน้าหลัก 7.5)</p> <p>ตัวชี้วัด 1.4 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง (หน้าหลัก 7.5)</p> <p>ตัวชี้วัด 1.5.2 (1) การพัฒนากำลังคนด้านดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน (หน้าหลัก 1)</p> <p>ตัวชี้วัด 5.3 การรักษาและบำรุงบุคลากรภารกิจโครงการ THEOS-2 และเทคโนโลยีระบบดาวเทียมของประเทศ (หน้าหลัก 3)</p> <p>ตัวชี้วัด 5.4.1 การบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร เพื่อรองรับการปรับปรุง (Upgrade) โดยบริษัท Airbus (หน้าหลัก 2)</p>

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
		<p>ตัวชี้วัด 5.4.2 การพัฒนาพื้นที่ (Working Space) เพื่อเตรียมรองรับการติดตั้ง Innovative Singularity Platform และการทำงานของบุคลากร (หน้าหลัก 1)</p> <p>ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (หน้าหลัก 5)</p> <p>ตัวชี้วัด 3.2.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท) (ประสิทธิภาพ / รายได้) (หน้าหลัก 5)</p> <p>ตัวชี้วัด 3.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารโครงการบนฐานคุณค่า (Value Base PBM) (นวัตกรรม) (หน้าหลัก 5)</p> <p>ตัวชี้วัด 4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal (ตัวชี้วัดบังคับ) (หน้าหลัก 5)</p> <p>ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) (หน้าหลัก 5)</p> <p>ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการองค์กรมหาชน (หน้าหลัก 15)</p>
รวม	20	

2.3.2 รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สงป.)

ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด โดยได้น้อยกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด เกินค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 สรุปดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าเป้าหมาย	4	<p>ตัวชี้วัด 1 ระบบสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย (ดำเนินการภายใต้ รหัส 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา กิจกรรมภายใต้ MS8 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564)</p> <p>ตัวชี้วัด 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (ดำเนินการภายใต้ รหัส 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา กิจกรรมภายใต้ MS8)</p> <p>ตัวชี้วัด 12 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง (2a, 2b) ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน (ดำเนินการภายใต้ รหัส 63057 - โครงการพัฒนา ต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564) เนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ตัวชี้วัดจะแล้วเสร็จตามโครงการที่ดำเนินการกันหลัอมปีไป</p> <p>ตัวชี้วัด 8 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกกระดับ (12/15 หลักสูตร) เนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับการดำเนินงานปี 2563 ไปสนับสนุนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อว. รวมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยยังไม่มีกรอบรวมฯ ทั้งนี้ ทั้ง 4 ตัวชี้วัดได้มีหนังสือแจ้ง รมว.อว. ผ่าน ปอว. แล้ว</p>

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
2) ตามเป้าหมาย	7	<p>ตัวชี้วัด 4 จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนด้านนโยบาย</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 10 ห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลอง วิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้น้ำหนัก</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนชุมชน/พื้นที่ที่นาระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลไปใช้ประโยชน์</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์ทดสอบ Aerospace ที่ได้รับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพ มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ</p>
3) เกินกว่าเป้าหมาย	2	<p>ตัวชี้วัด 2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ</p> <p>ตัวชี้วัด 3 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>
รวม	13	

2.3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด โดยน้อยกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้ตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด เกินกว่าเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 4 สรุปดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1) น้อยกว่าเป้าหมาย	2	<p>ตัวชี้วัด 7 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. คาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย ประเมินโดย สำนักงาน ปปช. ประกาศแล้ว สทอภ. ได้คะแนน 77.68</p> <p>ตัวชี้วัด 15 ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม</p> <p>ตัวชี้วัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงดำเนินการไม่ได้ ได้มีหนังสือแจ้ง ปอว. แล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อว. ได้ประสานแจ้งว่าตัวชี้วัดที่ สทอภ. ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย นั้น อว. ได้รวมผลดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นแล้ว ภาพรวม อว. ดำเนินการได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งรายงานให้ อว. ขอให้ สทอภ. ระบุปัญหา อุปสรรค แจ้งไปด้วย</p>
2) ตามเป้าหมาย	6	<p>ตัวชี้วัด 4 นักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด 5 หลักสูตรด้าน ววน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร</p> <p>ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไข ปัญหาของประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด 13 ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม</p> <p>ตัวชี้วัด 16 ชุมชนท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา คาดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p> <p>ตัวชี้วัด 17 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ</p>
3) เกินกว่าเป้าหมาย	9	<p>ตัวชี้วัด 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อ ประชากร 10,000 คน-ปี</p>

ผลการดำเนินงาน	จำนวน	หมายเหตุ
		<p>ตัวชี้วัด 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>ตัวชี้วัด 3 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ตัวชี้วัด 8 เรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด 9 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ คาดว่าจะได้เกินกว่าเป้าหมาย</p> <p>ตัวชี้วัด 10 บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>ตัวชี้วัด 11 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ</p> <p>ตัวชี้วัด 12 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)</p> <p>ตัวชี้วัด 14 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม</p>
รวม	17	

2.4 ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 56 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ, ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ, ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ และ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 37 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ 5 สรุปดังนี้

การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)	
แผนเงิน	ผลเงิน	แผนงาน	ผลงาน
254,599,934.33 (ร้อยละ 100.00)	228,646,224.58 (ร้อยละ 89.81)	100.00	97.04

(1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สตอก. มีแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 254,599,934.33 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายจริง 228,646,224.58 บาท (ร้อยละ 89.81), ผูกพันงบประมาณข้ามปีแบบมีหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 21,947,690.52 บาท (ร้อยละ 8.62) และมีเงินเหลือจ่ายคืนกลับเป็นเงินสะสม สตอก. จำนวน 4,006,019.23 บาท (ร้อยละ 1.57)

แหล่งเงิน	วงเงินทั้งหมด	ผลจ่ายจริง	ผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564	คงเหลือ
เงินประมาณ พ.ร.บ.	144,741,335.64	124,848,922.62	19,232,519.54	659,893.48
เงินรายได้	1,374,586.05	875,750.00	348,606.00	150,230.05
เงินนวัตกรรม	17,175,330.00	17,175,330.00	-	-
เงินบริหารความเสี่ยง	3,146,096.20	3,146,096.20	-	-
เงินทุน สตอก.	84,690,775.08	79,558,792.41	2,366,564.98	2,765,417.69
เงินเบิกจ่ายแทนกัน	496,142.96	314,544.20	-	181,598.76
เงินสำรองรายได้	2,975,668.40	2,726,789.15	-	248,879.25
รวมทั้งรวม	254,599,934.33	228,646,224.58	21,947,690.52	4,006,019.23


(2) ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

(2.1) แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 แผนงาน/โครงการ

(2.2) แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงานและขยายสัญญาจ้าง จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ

สถานะผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	48	
2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผูกพันงบประมาณ ข้ามปี ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564	8	เนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงานและขยาย สัญญาจ้าง
รวม	56	

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management
แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

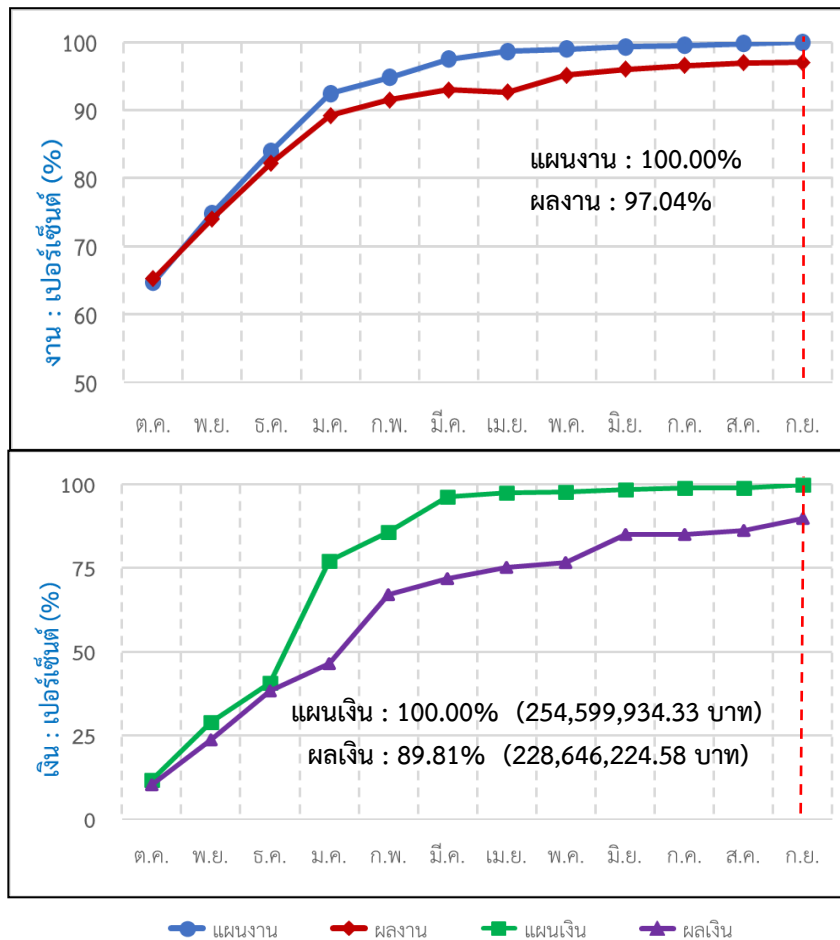

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ สทอภ.	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลเงินจ่ายจริง	กัณเงินไว้เบิกเหลือในปี		เงินคงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน		ร้อยละผลการดำเนินงาน
				กรณี มีหนี้ผูกพัน	กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน		แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ	8	1,557,536,633.49	373,513,914.49 (23.98%)	1,181,197,866.30 (75.84%)	-	2,824,852.70 (0.18%)	3	5	87.52
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System	4	18,727,973.00	6,955,304.72 (37.14%)	10,349,851.66 (55.26%)	-	1,422,816.62 (7.60%)	3	1	99.84
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม	7	82,973,901.06	56,534,134.42 (68.13%)	20,354,773.60 (24.53%)	-	6,084,993.04 (7.33%)	1	6	92.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	10	49,881,830.00	34,541,492.55 (69.25%)	13,463,871.79 (26.99%)	-	1,876,465.66 (3.76%)	5	5	95.90
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร	18	337,470,489.01	317,122,270.57 (93.97%)	5,364,096.97 (1.59%)	-	14,984,121.47 (4.44%)	8	10	97.51
รวม 5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ	47	2,046,590,826.56	788,667,116.75 (38.54%)	1,230,730,460.32 (60.14%)	-	27,193,249.49 (1.33%)	20	27	94.63
โครงการเพื่อการหารายได้	8	76,753,949.42	47,913,855.82 (62.43%)	18,686,544.10 (24.35%)	3,745,550.82 (4.88%)	6,407,998.68 (8.35%)	3	5	
รวมทั้งหมด	55	2,123,344,775.98	836,580,972.57 (39.40%)	1,249,417,004.42 (58.84%)	3,745,550.82 (0.18%)	33,601,248.17 (1.58%)	23	32	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายโครงการ/แผนงาน)

สัญลักษณ์

● ดำเนินการแล้วเสร็จ (23 โครงการ/แผนงาน)

○ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (32 โครงการ/แผนงาน)

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ/แผนงาน)						
63010 ○	โครงการ AIP เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ (ชลธิป / AIP) งบที่ได้รับ 910,841.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 410,841 บาท และเงินรายได้ 500,000 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	จ่ายจริง 644,083.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 225,000.00 บาท คงเหลือ 41,758.00 บาท	70.71	93.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มีหน่วยงานที่เห็นถึงประโยชน์ของ AIP และนำไปใช้ด้านต่างๆ 1) คณะอนุกรรมการหาแนวทางการส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์และอาชีพตามแนวพระราชดำริสร้างป่าสร้างรายได้ นำ AIP ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องของศักยภาพเชิงกายภาพกับทางเลือกอาชีพ 2) สนง. EEC สนใจ AIP ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สนง. EEC พัฒนา Data Visualizaion แต่ต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ SAP ที่ EEC พัฒนาอยู่ 3) สนง. สถิติแห่งชาติ สนใจในการใช้ AIP ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับโจทย์วิเคราะห์ตามแต่ละสถานการณ์ 2. ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อร่วมกันศึกษา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Policy Innovation, Strategy Innovation ระหว่าง สทอภ. กับ สททช., สทอภ. กับ TDRI และมูลนิธิเสนาะ อุณาภูล 3. นำ AIP ไปร่วมออกแบบและพัฒนา ในรูปแบบเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะขยายผล

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						เพิ่มขึ้นในอนาคต 2) หน่วยงานภายในพื้นที่ EEC ทั้ง 3 จังหวัด ในประเด็นด้านทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมาย (1) เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อมีระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม และ (3) เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำให้เพียงพอ โดยต้องการข้อมูล 2 ด้าน คือ แหล่งการส่งจ่ายและความต้องการน้ำ และภัยพิบัติทางน้ำ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (งปพัฒนาบุคลากร)		วงเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 225,000 บาท			เลขที่สัญญา 12/2563 ลว. 10 มี.ค. 63 วงเงินในสัญญา 750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 มี.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63
63021 ⊖	โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (พรเทพ / Theos-2) งบที่ได้รับ 75,281,278.92 บาท (เงิน พ.ร.บ. 18,958,000.00 บาท เงินบริหารความเสี่ยง 4,554,600.00 บาท และ เงินทุน 51,768,678.92 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 52,854,323.09 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 19,910,524.73 บาท คงเหลือ 2,516,431.10 บาท	70.21	99.85	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกันยายน 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการกิจพิเศษ SmallSAT และ MMGS เช่น ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้ปฏิบัติการกิจพิเศษ จำนวน 19 คน (ปฏิบัติงาน ณ ประเทศอังกฤษ), ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ, ค่าระงับรายได้อื่น ค่าประกันสังคม, ค่าระงับอาชีพการศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าสัญญาณย่านความถี่ S Band เป็นต้น 2. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม : บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเบิกจ่าย 3. บำรุงรักษาระบบจานดาวเทียม X-band ยี่ห้อ VIASAT และ ยี่ห้อ L3 Datron 4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ L3 (Datron)		3,120,000 บาท			เลขสัญญา 9/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 5,200,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 และ 4 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	2. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ VIASAT		2,137,500 บาท			เลขสัญญา 7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 4,750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 4 - 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ธ.ค. 63
	3. จ้างเหมาพัฒนาระบบเทอร์มินอลส่งถ่ายภาพสำหรับผู้ใช้งานทางทหาร (Military User Terminal)		1,950,000 บาท			เลขสัญญา 30/2563 ลว. 25 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,950,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 26 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1-3 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64
	4. กิจกรรมการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (งานเพิ่ม)		7,655,024.73 บาท			บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
	5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม :		720,000 บาท			บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
	6. จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2		2,480,000 บาท			เลขสัญญา 26/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,480,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63
	7. จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดินสำหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2		170,000 บาท			เลขสัญญา 130/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 170,000 บาท จำนวน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63
	8. จ้างเหมาพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสำหรับข้อมูลดาวเทียมโครงการ THEOS-2		498,000 บาท			เลขสัญญา 94/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 498,000 บาท จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.พ. 64
	9. จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน (Ground Intelligent Network System)		495,000 บาท			เลขสัญญา 99/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 495,000 บาท จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 9 ก.ค. 63 - 4 ก.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.ค. 64
	10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ		640,000 บาท			เป็นค่ามัดจำที่พักเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปประเทศอังกฤษ จำนวน 8 คน x 80,000 บาท จะมีการเบิกจ่าย เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทย ในเดือน มี.ค. 64

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63026 ●	แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (ระวีวรรณ / สยศ.) งบที่ได้รับ 126,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 126,000.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 61,500.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 64,500.00 บาท	48.81	92.30	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. ดำเนินการกำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้นำ ร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และดำเนินการผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สทอภ. เป็นหน่วยรับผิดชอบแจ้งวัตถุประสงค์ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการจัดทำกรอบงานของสำนักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office : RLO) เรียบร้อยแล้ว 4. ดำเนินการกำหนดหัวข้อสำหรับเป็นกรอบการประเมินความต้องการในการมีกฎหมายอวกาศของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
63061 ●	แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP (อิศราพร / AIP) งบที่ได้รับ 1,061,900.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 710,900.00 บาท และ เงินทุน 351,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	จ่ายจริง 959,736.40 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 102,163.60 บาท	90.38	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. จัดจ้างลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้ภารกิจ AIP 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจ AIP ขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และทันตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สทอภ.
63065 ●	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพื่อขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศ (ปกรณ / AIP) งบที่ได้รับ 500,000.00 บาท (เงินรายได้ 500,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	จ่ายจริง 500,000.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ - บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. ข้อมูลดาวเทียมที่มีศักยภาพให้ข้อมูล PM2.5 โดยตรง และดาวเทียมที่ให้ข้อมูลปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อ PM 2.5 Concentrations 2. ชุดคำสั่งเพื่อการวิเคราะห์และสกัดค่า PM2.5 Concentrations เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่จากดาวเทียมแบบ

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						อัตโนมัติครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่อัปเดตทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ 2 ข้อ สามารถนำไปทำเป็นฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิด PM2.5 เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนได้อีกในอนาคต
63066 ⊖	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (พรเทพ / Theos-2) งบที่ได้รับ 1,431,720,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,431,720,000.00 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 314,280,000.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,117,440,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	21.95	97.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. กิจกรรม SmallSAT Critical Design Review (CDR) ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย MS7 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 2. ดำเนินการในส่วนของ MS-8 Instrument AIT TEST Readiness Review (I-TRR) และ MS-9 Platform AIT TRR (P-TRR) and End of AIP Development and Implementation P-TRR แล้วเสร็จ 100 % และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 3. กิจกรรม Module Readiness Review (MRR) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% 4. ได้มีการประชุม Local Partner for EEC & Nan ระหว่าง สทอภ. และ Airbus เพื่อหาผู้รับผิดชอบในส่วนของ EEC และ นำน โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. การพัฒนาดาวเทียมหลัก MS-8 Instrument AIT TEST Readiness Review (I-TRR) และ MS-9 Platform AIT TRR (P-TRR) and End of AIP Development and Implementation		1,117,440,000.00 บาท			Airbus ได้ดำเนินการในส่วนของ I-TRR และ P-TRR แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากการพัฒนาดาวเทียมหลัก MS 8 ในส่วนของ AIP ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีเบิกจ่ายในงวดงาน 8-9 คาดว่าจะเจรจาและเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63129 ⊖	โครงการวิเคราะห์ภาคทัศน์ด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างและหลังสถานการณ์ COVID – 19 เพื่อการพัฒนา AIP (ชลธิป / AIP) งบที่ได้รับ 2,400,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 2,400,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (กานดาศรี)	จ่ายจริง - บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 2,300,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท	0.00	38.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่ได้รับ รายงานสถานการณ์โควิดและผลกระทบทั้ง 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางในการหามาตรการสำหรับการฟื้นฟูประเทศ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย		2,300,000 บาท			เลขที่สัญญา 23/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 วงในสัญญา 2,300,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ม.ค. 64
63132 ⊖	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (พรเทพ / Theos-2) งบที่ได้รับ 45,536,613.57 บาท (เงินทุน 45,536,613.57 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 4,214,272.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 41,322,341.57 บาท คงเหลือ - บาท	9.25	80.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่ได้รับ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น : ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น		41,322,341.57 บาท			เลขที่สัญญา 5/2563 ลว. 7 พ.ค. 63 วงในสัญญา 210,713,600 บาท จำนวน 15 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 7 พ.ค. 63 - 29 ต.ค. 64 : งานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการ สทอภ. อนุมัติแล้ว และต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดส่งเอกสารไป 1 ครั้งแล้ว แต่จำเป็นต้องแก้ไขเอกสารบางรายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารชี้แจงสำนักงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (4 โครงการ/แผนงาน)						
63013 ●	แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมฯ (ศิริศักดิ์ / สอร.) งบที่ได้รับ 2,110,550.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 2,073,160.00 บาท และ เงินทุน 37,390.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงฤทธิ)	จ่ายจริง 1,808,381.32 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 302,168.68 บาท	85.68	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ สนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรม อันเกิดขึ้นภายในสถาบันนิเวศอุตสาหกรรมฯ ได้ครบถ้วน และมีผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้แล้วเสร็จทุกรายการ

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63063 ⊖	โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace (ณัฐวัฒน์ / สอร.) งบที่ได้รับ 14,595,653.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 11,077,320.00 บาท, เงินทุน 3,316,610.00 บาท และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 201,723.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงฤทธิ)	จ่ายจริง 3,315,280.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 10,349,851.66 บาท คงเหลือ 930,521.34 บาท	22.71	99.36	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. จัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อรองรับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2563 2. ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการขอรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขึ้นงานที่เข้ารับบริการทดสอบจำนวน 268 ชิ้น
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและงบดำเนินการสนับสนุนภารกิจการทดสอบดาวเทียมและอากาศยาน		10,050,000 บาท	74.34	100.00	เลขที่สัญญา สอร. 2/2563 ลว. 5 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 6 พ.ค. 63 - ธ.ค. 63 คาดว่าจะดำเนินงานและเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 (สุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
	2. ค่าวัสดุเพื่อใช้สำหรับศูนย์ทดสอบ Aerospace		114,851.66 บาท			อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ต.ค. 63
	3. จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ		185,000.00 บาท			เนื่องจากเงื่อนไขการสอบเทียบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าจะดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63
63064 ●	โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำทางแม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ศิริพัทธ์ / สอร.) งบที่ได้รับ 201,870.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 201,870.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงฤทธิ)	จ่ายจริง 150,080.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 1,790.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ จัดจ้างลูกจ้างโครงการสำหรับการบริหารโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนได้รับงบประมาณ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 9,503,240 บาท
63124 ●	โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการภัยโควิด COVID2019 เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลที่ร้องขอ (ศิริพัทธ์ / สอร.) งบที่ได้รับ 1,819,900.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,819,900.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงฤทธิ)	จ่ายจริง 1,681,563.40 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 138,336.60 บาท	92.40	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3D Printing and Mold Injection Face Shield หน้ากากป้องกันโรค ผลิตโครงสร้างจากเครื่อง 3D printing จำนวน 35,000 ชิ้น และมอบให้แก่หน่วยงานการแพทย์ ทั้งหมด 57 หน่วยงาน

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (7 โครงการ/แผนงาน)						
63027 ⊗	โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (วราทิพย์ / สปภ.) งบที่ได้รับ 2,925,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 2,465,000.00 บาท และ เงินทุน 460,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 1,882,515.92 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,014,365.45 บาท คงเหลือ 28,118.63 บาท	64.36	97.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อบริบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณสมบัติในการการติดตามสถานการณ์ได้เป็นระยะ มีการพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์ทิศทางเคลื่อนที่ของมลพิษ (Trajectory model) ให้ครอบคลุมพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ตรวจวัดจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง สามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยได้ รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบจะทำการสร้างรายงาน เมื่อพบมลพิษในทะเลและส่งออกการแจ้งเตือนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล โลก ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 2. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (การนำระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ อ่าวไทย, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่อ่าวไทยตัว ก, กลุ่มนักวิจัยชุมชนพื้นที่ปากอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่อ่าวไทยตัว ก
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อบริบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		700,000 บาท			เลขที่สัญญา 22/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1.4 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 17 มิ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาวงงานที่ 3 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
	2. จ้างเหมาพัฒนาระบบประมวลผลการติดตามสภาพทางทะเลแบบกึ่งอัตโนมัติ		185,500 บาท			เลขที่สัญญา 97/2563 ลว. 1 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 0.265 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 2 ก.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ซึ่งส่งมอบงานมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63
	3. ค่าวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์		128,865.45 บาท			อยู่ระหว่างรอบริษัทฯ ส่งของภายในวันที่ 7 พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63
63028 ⊖	โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิเชื่อมโลก จากอดีตผ่านปัจจุบันสู่นาคต (ปียวรรณ / สปก.) งบที่ได้รับ 2,843,350.00 บาท (เงินทุน. 2,842,900.00 บาท และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 450 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 2,015,739.58 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 154,080.00 บาท คงเหลือ 673,530.42 บาท	70.89	93.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ สร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างกลยุทธ์/แผนงาน/แนวทาง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 "สุวรรณภูมิ: ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Suvarnabhumi: Terra of ASEAN Co-cultural Values)" วันที่ 11 พ.ย. 62 ณ Casean อาคารไซเบอร์เวสต์ กทม. ผู้เข้าร่วม 33 คน 2. เปิดตัวโครงการ "สุวรรณภูมิ: ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Suvarnabhumi: Terra of ASEAN Co-cultural Values)" วันที่ 12 พ.ย. 62 ณ อาคารไซเบอร์เวสต์ กทม. ผู้เข้าร่วม 92 คน 3. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2 "สุวรรณภูมิ: ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Suvarnabhumi: Terra of ASEAN Co-cultural Values)" วันที่ 25-27 พ.ย. 62 ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้เข้าร่วม 42 คน 4. จัดประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 3 (Focus group 3) วันที่ 25 ก.พ. 63 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ กทม. ผู้เข้าร่วม 16 คน 5. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (มณฑลปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 มี.ค. 63 ณ ศูนย์รังสรรค์คุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม 68 คน 6. จัดประชุมเสวนากลุ่มเป้าหมาย (Working group) ครั้งที่ 5 และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ สทอภ. ร่วมกับ 10 หน่วย ได้แก่ 1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2) กรมศิลปากร 3)

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4) มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี) 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต 8) มหาวิทยาลัยบูรพา 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 10) มูลนิธิสัมมาชีพ วันที่ 21 ส.ค. 63 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. ผู้เข้าร่วมประชุม 74 คน
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. พิมพ์หนังสือสุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive summary : Suvarnabhumi Terra Incognita)		154,080 บาท			เลขที่สัญญา 129/2563 ลว. 17 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 154,080 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ก.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่าง อาร์ตเวิร์ก ครั้งที่ 1 คาดว่าจัดพิมพ์และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
63035 ⊗	โครงการครบรอบ สทอภ. 20 ปี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (กมลมาศ / กพล.) งบที่ได้รับ 1,340,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 90,000.00 บาท และเงินรายได้ 1,250,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 89,720.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,248,280.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท	6.70	75.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตที่ได้รับ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดผลิตสติ๊กเกอร์พิเศษ 20 ปี สทอภ. และจัดทำหนังสือกาลานุกรม รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างผลิตสติ๊กเกอร์พิเศษ 20 ปี สทอภ.		598,000 บาท			เลขที่สัญญา 28/2563 ลว. 27 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 598,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค. - 25 พ.ย. 63 : บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำร่างสติ๊กเกอร์ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
	2. จ้างจัดทำหนังสือกาลานุกรม		650,280 บาท			อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ. 64
63044 ⊗	แผนการดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม (สภภ./สผภ./กภภ./กพล.) งบที่ได้รับ 59,079,351.06 บาท (เงิน พ.ร.บ. 37,905,510.00 บาท,	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 37,534,974.10 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 16,978,436.47 บาท คงเหลือ 4,565,940.49 บาท	63.53	87.40	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. รายได้ สทอภ. 114,871,430 บาท 2. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง สามารถตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	เงินทุน 20,531,620.00 บาท และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 642,221.06 บาท)					<p>ตอบสนองสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่งทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง</p> <p>3. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต) ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งให้ตอบสนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทั่วทั้ง</p> <p>4. ระบบการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักหรือ Downtime ภายใต้อ SLA (SLA เท่ากับ ร้อยละ 99.53)</p> <p>5. สนับสนุนการจัดทำชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลเฉพาะเรื่อง ผลิตข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานให้บริการสำรวจพื้นที่ในการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และระบบการให้บริการสามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักหรือ Downtime ภายใต้อ SLA</p> <p>6. มีภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกที่พร้อมสำหรับการบริการ (จำนวนภาพที่ให้บริการต่อเดือน จำนวน 12,435 ภาพ)</p>
	<p>กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน</p> <p>1. ค่าธรรมเนียมรับสัญญาดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ</p>		6,860,610 บาท			<p>เลขที่สัญญา กพล802/2563 ลว.7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 6,860,610 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : ลงนามล่าช้าเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้บริษัท e.GEOS S.p.A. ไม่สามารถส่งเอกสารต้นฉบับซึ่งออกโดยสถานทูต และเอกสารต้นฉบับของบริษัทมาให้คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายใน ก.พ. 64</p>
	2. เช่าคลาวด์ และ Colocation		3,314,325 บาท			<p>เลขที่สัญญา 7/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 4,419,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 มิ.ย. 63 - 27 ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างการเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ก.พ. 64</p>

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA)		1,500,000 บาท			เลขที่สัญญา 18/2563 ลว. 12 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 3,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 13 พ.ค. 63 - 8 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
	4. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล Big Tank (MA)		395,000 บาท			เลขที่สัญญา 21/2563 ลว.25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 790,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63
	5. รักษาความต่อเนื่องระบบเรดาร์ชายฝั่ง		460,800 บาท			เลขที่สัญญา 17/2563 ลว. 23 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,152,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 24 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ 6 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ใน ต.ค. 63
	6. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ (MA)		495,000 บาท			เลขที่สัญญา 20/2563 ลว. 25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 990,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63
	7. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage		118,500 บาท			เลขที่สัญญา 88/2563 ลว.6 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 237,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 พ.ค. -3 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน ธ.ค. 63
	8. จ้างเหมาเช่าใช้บริการ Google Apls		99,889.01 บาท			เลขที่สัญญา 11/2563 ลว.17 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างการเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ธ.ค. 63
	9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed		2,457,375.65 บาท			เลขที่สัญญา Contract No.16/2020 ลว. 7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,457,375.65 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64
	10. จ้างเหมาบำรุงรักษาบบรับสัญญาณดาวเทียม รายละเอียดปานกลาง		206,666 บาท			เลขที่สัญญา สอธ.12/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 516,665 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิ.ย. - 8 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	11. ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		550,000 บาท			เลขที่สัญญา 25/2563 ลว.13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 550,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. – 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 11 พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63
	12. ค่าจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด		301,466.51 บาท			อยู่ระหว่างการจัดหา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64
	13. จ้างจัดหาและทำสื่อประชาสัมพันธ์		218,804.30 บาท			เลขที่สัญญา 117/2563 ลว.25 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 218,804.30 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 ส.ค. – 26 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างจัดหาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63
63050 ⊖	แผนงานจัดหาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (ชินตา / สปภ.) งบที่ได้รับ 10,386,200.00 บาท (เงินทุน 10,386,200.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 9,396,707.52 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 734,611.68 บาท คงเหลือ 254,880.80 บาท	90.47	97.80	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 500 เรื่อง 2. รายได้จากค่าบริการข้อมูลจากดาวเทียม และการบริการภูมิสารสนเทศ จำนวน 114,871,430 บาท (ตัวเลขเดียวกับโครงการ 63044 การดำเนินงานร่วมกัน)
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง		734,611.68 บาท			การส่งถ่ายข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังไม่สามารถบันทึกภาพที่ปลอดภัยได้ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายใน ม.ค. 64
63128 ●	โครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น จากการขาดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี (ศิริลักษณ์ / สปภ.) งบที่ได้รับ 3,400,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,400,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 2,874,477.30 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 525,522.70 บาท	84.54	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. รายงานสรุปผลการประเมินความเครียด และความเสียหายของพืชไม้ผลยืนต้นจากการขาดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้ราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของพืช

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<p>เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือในกลไกการนำใช้ข้อมูลเครื่องมือ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ GISAgro</p> <p>2. หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร/กลุ่ม/เครือข่าย ในพื้นที่เป้าหมาย มีข้อมูล/แผนที่ความเครียดของไม้ผลจากการขาดน้ำ แผนที่ความชื้นในดินจากดาวเทียม และแผนที่สภาพแหล่งน้ำจากดาวเทียม รายตำบล สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกไม้ผล (เงาะ ทุเรียน มะม่วง)</p> <p>3. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 120 คน ได้รับข้อมูล/แผนที่และคำแนะนำ สำหรับการชี้เป้า ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของไม้ผล (เงาะ ทุเรียน มะม่วง)</p>
63131 ⊖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (ยรรยง / สผภ.) งบที่ได้รับ 3,000,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,000,000.00 บาท)	ปรอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 2,740,000.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 225,000.00 บาท คงเหลือ 35,000.00 บาท	91.33	96.00	<p>คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>ผลผลิตที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาข้อมูลสถานที่สำคัญทั่วประเทศแล้วเสร็จ 2. จัดหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลแล้วเสร็จ 3. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 จาก 12 งวด
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล		225,000 บาท			เลขที่สัญญา 92/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 300,000 บาท จำนวน 12 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมด ภายในเดือน ก.ค. 64
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ/แผนงาน)						
63005 ●	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (อำนวยการ / สวก.) งบที่ได้รับ 768,209.65 บาท (เงิน พ.ร.บ. 768,209.65 บาท)	ป.อ.สวก. (ดำรงศฤทธิ)	จ่ายจริง 721,509.96 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 46,699.69 บาท	93.92	100.00	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ผลผลิตที่ได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ของ สทอภ. จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชา ตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<ol style="list-style-type: none"> 1) ระบบส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ (Area Based Management) เพื่อสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. 2) ระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (Bampen) 3) ระบบเฝ้าระวังทางอวกาศ จำนวน 1 ระบบ (Thai-SSA) 4) ต้นแบบระบบ Space traffic Management จำนวน 1 ระบบ (ZIRCON) 5) Satellite Simulator สำหรับดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวน 1 ระบบ (Thai Space Consortium) 2. มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 9 เรื่องประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) เรื่อง THAILAND YOUTH INNOVATION INTERNSHIP PROGRAM : SATELLITE TELECOMMUNICATION ENGINEER 2) เรื่อง TOTAL SUSPENED SEDIMENT (TSS) DYNAMICS IN CHI-MUN RIVER BASIN, THAILAND USING REMOTE SENSING 3) เรื่อง Implementing GIS for Air Navigation Aids Infrastructure Optimization 4) เรื่อง GIS platform for augmenting space situational awareness 5) เรื่อง Space-based sensor data provider nodes platform for disaster monitoring 6) Adaptive 4D trajectory Planning, Automatic Change Detection System for eTOD 7) เรื่อง Development of Conjunction risk sssessment

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						analysis tool by GISTDA 8) เรื่อง Development of Space Traffic Management System: ZIRCON 9) เรื่อง Preliminary Orbit Analysis for Thai Space Consortium Small Satellite
63008 ⊖	โครงการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอวกาศ (Space Frontier Research) (ดำรงศฤทธิ / สวภ.) งบที่ได้รับ 15,770,190.35 บาท (เงิน พ.ร.บ. 10,934,790.35 บาท, เงินทุน 4,835,400.00 บาท)	ป.อสภ. (ดำรงศฤทธิ)	จ่ายจริง 5,002,618.21 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 10,706,721.79 บาท คงเหลือ 60,850.35 บาท	31.72	78.08	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มีการติดตั้งระบบการจัดการจราจรอวกาศ (ZIRCON) Space Traffic Management System และดำเนินการทดสอบระบบฯ แล้วเสร็จ 2. ต้นแบบ Flight Software ดาวเทียมระดับพื้นฐาน ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณ วน. จากการเบิกจ่าย แทนกันกับ สตร. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา MOA ระหว่าง สตร. กับ สทอภ. และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ไปพลางก่อน 3. มีห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้น้ำหนักถ่วง เป็นไปตามตัวชี้วัด สงป. โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ วงเงิน 10,400,000 บาท คงเหลือการเบิกจ่ายจำนวน 2 งวดงาน ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน ม.ค. 64
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรับการพัฒนา liquid crystal ในสภาวะไร้น้ำหนักถ่วง (Space EX)		10,400,000 บาท			เลขที่สัญญา สอธ.3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 10,400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 64 : ลำช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ม.ค. 64
	2. จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ		306,721.79 บาท			เลขที่สัญญา สอธ.6/2563 ลว.24 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 3,800,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 25 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทไม่

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชา ตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						สามารถดำเนินการตาม TOR ได้และขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ งวดที่ 4 ออกไปอีก 282 วัน ((ขยายจนถึง ก.ค. 64)
63011 ⊖	แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (ศิริพัทธ์ / สอร.) งบที่ได้รับ 8,800,900.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 5,443,900.00 บาท, เงินรายได้ 2,736,300.00 บาท, เงินทุน 469,400.00 บาท และ เงินรายได้ ตามอำนาจ ผสทอภ. 151,300.00 บาท)	ป.อ.สวท. (ดำรงค์ฤทธิ)	จ่ายจริง 8,361,469.44 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 432,650.00 บาท คงเหลือ 6,780.56 บาท	95.01	97.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมภายใน Space Inspirium จำนวน 77,501 คน
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน					
	1. จ้างเหมาระบบจำหน่ายตัว เครื่องกันน้ำคน		234,700 บาท			ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
	2. ซ่อมบำรุงเครื่องเล่น นิทรรศการโซนที่ 17 Google Street View		176,550 บาท			ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
	3. จัดจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ และซ่อมแซมอุปกรณ์โซน นิทรรศการศาสตร์พระราชา		21,400 บาท			ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63032 ⊖	แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร เพื่อสร้างบุคลากรฯ (ฐนิดา / สทอ.) งบที่ได้รับ 12,402,200.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 9,014,000.00 บาท, เงินทุน 3,388,200.00 บาท)	ป.อ.สวท. (ดำรงค์ฤทธิ)	จ่ายจริง 11,426,766.13 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 80,000.00 บาท คงเหลือ 895,433.87 บาท	92.13	97.75	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มีเครือข่ายระดับภูมิภาคขับเคลื่อนภารกิจ สทอภ. (จัดประชุมคณะกรรมการร่วม สทอภ. และเครือข่าย และคณะทำงานฯ อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคฯ, จัดกิจกรรมและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจของ สทอภ. ในโครงการที่สำคัญ, จัดทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศแล้วเสร็จร้อยละ 100 2. ARTSA Center มีผลผลิต ดังนี้ 2.1 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและดำเนินโครงการวิจัยร่วม กับ หน่วยงานนานาชาติ อาทิ ITC, UNESCAP, UNOSAT, GEOWG,

รหัส โครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชา ตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<p>EU, NASA, NIER (South Korea) และ JAXA(SAFE)</p> <p>2.2 จัดกิจกรรมหลักสูตร Training workshop on Strengthened Institutional Capacities to Effectively Address Shared Challengesฯ วันที่ 26-30 พ.ย. 62 ณ SKP กับ UNESCAP</p> <p>2.3 จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training For The Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี</p> <p>2.4 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Remote Sensing of Land-Use/Cover Change, and Climate impacts in Coastal Zone" ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต</p> <p>2.5 จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training For The Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี</p> <p>3. Training for Trainer มีผลผลิต ดังนี้</p> <p>3.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร Non-degree จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค. 63 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 32 คน และหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ทั้ง 2 หลักสูตร จัดฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ.(บางเขน)</p> <p>3.2 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร Non-degree พัฒนากำลังคนที่สอดคล้องภารกิจ THEOS-2 จำนวน 10 กลุ่ม โดยแยกออกเป็น Module ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานฯ ประมาณ 50 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง</p>

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<p>อีก 10 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Module นั้นๆ</p> <p>3.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร Non-degree และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร Non-degree ระหว่าง 25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 79 คน จาก 18 หน่วยงาน</p> <p>3.4. มีร่างหลักสูตร Non-degree จำนวน 10 Modules ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ</p> <p>4. นักเรียนทุน (จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการต่อยอด) จำนวน 58 คน</p> <p>5. หลักสูตร SCGI Master Program มีผลผลิต ดังนี้</p> <p>5.1. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร SCGI Master Program จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>5.2. เปิดการเรียนการสอนให้กับนิสิตรุ่นที่ 3 ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563</p> <p>5.3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ Intensive Course สำหรับนิสิตรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านริมน้ำ จ.จันทบุรี</p> <p>5.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง และ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง</p>
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Dr.Haoran Zhang) งวดที่ 3		80,000 บาท			เลขที่สัญญา สอ.ร.1348/2563 ลว.18 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 80,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 : ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63054 ●	โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน : G-Rice (ธนากร / สวภ.) งบที่ได้รับ 1,060,000.00 บาท	ป.อ.สวภ. (ดำรงฤทธิ์)	จ่ายจริง 942,655.23 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 117,344.77 บาท	88.93	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ ส่งเสริมนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร/ชุมชนเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 20 กลุ่ม ตามตัวชี้วัด

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	(เงินทุน 1,060,000.00 บาท)					จำนวนชุมชน พื้นที่ที่นำ Solution / Application ไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน (ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2561-64) ซึ่งสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับ กลุ่มเกษตรกร/ ชุมชนเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ่
63055 ●	โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการพระราชดำริ : GMIS (ธนากร / สวภ.) งบที่ได้รับ 808,700.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 200,700.00 บาท, เงินทุน 608,000.00 บาท)	ป.อ.สวภ. (ดำรงศฤทธิ)	จ่ายจริง 783,359.60 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 25,340.40 บาท	96.87	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการพระราชดำริ และโครงการขยายผลเพื่อสืบสานต่อยอดรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. จาก การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด 2. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.) ได้ขอความอนุเคราะห์นำระบบต้นแบบ ที่ สทอภ. และ ศปร. พัฒนาร่วมกัน (โดยพัฒนาจากระบบ GMIS) ไปพัฒนาต่อยอด โดยใช้งบประมาณ 9.5 ล้านบาท ซึ่งทาง ศปร. ได้ตั้งงบประมาณแล้วในปี 2563 และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2564
63057 ○	โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 (ศุภัชชา / สวภ.) งบที่ได้รับ 7,723,550.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,456,950.00 บาท, เงินทุน 4,266,600.00 บาท)	ป.อ.สวภ. (ดำรงศฤทธิ)	จ่ายจริง 5,098,217.74 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 2,084,500.00 บาท คงเหลือ 540,832.26 บาท	66.01	85.60	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ได้แก่ 1.1. ระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขและสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ 1.2. มีข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการคมนาคมทางอากาศตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน 1 สนามบิน (ดำเนินการจัดจ้าง และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน คงเหลืออีก 2 งวดงาน) จำนวนเงิน 2,205,000 บาท ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน ธันวาคม 2563

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						2. นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง A Distributed Metaheuristic Approach for Complexity Reduction in Air Traffic for Strategic 4D Trajectory Optimization
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน		1,984,500 บาท			เลขที่สัญญา สอว.15/2563 ลว.4 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,205,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 : ล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ก.พ. 64
	1. จ้างเหมาสำรวจจัดทำข้อมูลสนามบินและการสำรวจภาคพื้น					
	2. วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา		100,000 บาท			เลขที่สัญญา สอว.21/2563 ลว.30 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. -30 พ.ย. 63 : อยู่ดำเนินการจัดหาหนังสือคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 63
63062 ⊖	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต (จันทิวา / สพอ.) งบที่ได้รับ 1,799,000.00 บาท (เงินรายได้ 1,799,000.00 บาท)	ป.อ.สว.ก. (ดำรงค์ฤทธิ)	จ่ายจริง 1,555,856.24 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 160,000.00 บาท คงเหลือ 83,143.76 บาท	86.48	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มี Knowledge Platform เป็นฐานการสร้างขีดความสามารถด้าน S&GI ของประเทศที่ยอมรับในสากล 2. มีห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ห้องเรียนรู้ครบวงจรที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และศึกษานอกห้องเรียน จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ 3. มีสื่อการเรียนรู้ (Virtual Community Platform) จำนวน 10 Content 4. มีการเข้าถึงสื่อเรียนรู้ Online 39,388 ครั้ง 5. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้สู่ภายนอก ผ่าน Community Knowledge Platform มากกว่า 10 สื่อ 6. อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน		160,000 บาท			เลขที่สัญญา สอว.1279/2563 ลว.18 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 : ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
	1. ค่าจ้างเหมาการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้แบบหมุนเวียน					

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63067 ●	โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระยะที่ 1 (ณัฐวัฒน์ / สวก.) งบที่ได้รับ 299,080.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 299,080.00 บาท)	ป.อ.สวก. (ดำรงศักดิ์)	จ่ายจริง 199,040.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 100,040.00 บาท	66.55	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ มีการวางแผน ออกแบบ การใช้ประโยชน์และปรับพื้นที่ Space Innopolis ใน EECi แล้วเสร็จ
63125 ●	โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ โลกสู่โรคสู่ภัย COVID-19 ด้วยการจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (จันทิมา / สพอ.) งบที่ได้รับ 450,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 450,000.00 บาท)	ป.อ.สวก. (ดำรงศักดิ์)	จ่ายจริง 450,000.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ - บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ มีสื่อเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโควิด 19 โดยนำไปใช้กับศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศชุมชน จำนวน 1 ชุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร (18 โครงการ/แผนงาน)						
63003 ●	แผนงานบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ระวีวรรณ / สยศ.) งบที่ได้รับ 3,888,292.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,735,292.00 บาท, เงินบริหารความเสี่ยง 153,000.00 บาท)	รอง ผ.สทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 3,326,571.29 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 561,720.71 บาท	85.55	95.59	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก สทอภ. ในมิติต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร 5 ประเด็น ได้แก่ 1.รายงานเรื่องการประเมินทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจอวกาศ โดยมีประเด็นสำคัญในการผลักดัน 2. Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities 3. แนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของ สทอภ. 4. รายงานผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของ New Normal ต่อองค์กร 5. Earth Space System (ESS) 2. นำแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. ที่ผ่านการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสนอขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 3. แผนกลยุทธ์ต่างประเทศได้รับความเห็นชอบจาก ผ.สทอภ. แล้ว 4. จัดทำความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ จำนวน 3 เรื่อง 5. นำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<p>2564 ของ สทอภ. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563</p> <p>6. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติการ และ ตัวชี้วัดต่างๆ ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการ สทอภ. ทุกไตรมาส</p> <p>7. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร / GISTDA Future Risk และนำเสนอรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ สทอภ. และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ สทอภ. ครบทุกไตรมาส</p> <p>8. การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักได้ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้</p>
63004 ⊖	โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562 (วรรณัฐ / สยศ.) งบที่ได้รับ 1,100,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,100,000.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 325,500.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 759,500.00 บาท คงเหลือ 15,000.00 บาท	29.59	90.55	<p>คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563</p> <p>ผลผลิตที่ได้รับ</p> <p>รายงานผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม / Value Mechanism ในโครงการและองค์กร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,677.1 ลบ. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 1,318.37 ลบ.
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562		759,500 บาท			เลขที่สัญญา 16/2563 ลว. 3 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,085,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาปรับปรุงรายงานชั้นกลาง (งวดงานที่ 2 จาก 3 งวดงาน) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63006 ●	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร (ณัฐนันท์ / ผลค.) งบที่ได้รับ 4,156,000.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 3,785,500.00 บาท, เงินรายได้ 220,500.00 บาท, และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผลทอภ. 150,000.00 บาท)	ผลทอภ.	จ่ายจริง 2,552,001.85 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 1,603,998.15 บาท	61.41	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. คณะกรรมการ สทอภ. มีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สทอภ. ผ่านการประชุม คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2. คณะกรรมการ สทอภ. จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 2.1 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 และ Director Accreditation Program (DCP298/2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2.2 นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ จำนวน 1 หลักสูตร คือ Director Accreditation Program (DCP293/2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 3. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 3.1 ต่ออายุลิขสิทธิ์การเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 3.2 จัดให้มีการทบทวนการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภายในของ สทอภ. ใช้งานระบบฯ ดังกล่าวทดแทนการแจกเอกสารประชุมในรูปแบบกระดาษ เป็นไปตามนโยบาย ผลทอภ.

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63009 ⊖	แผนงานบริหารงาน สนับสนุน และกำกับ THEOS-2 (เวียร์เธียร์ / CEO Team) งบที่ได้รับ 6,118,308.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 2,369,808.00 บาท, เงินรายได้ 2,248,500.00 บาท, และ เงินทุน 1,500,000.00 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 3,595,183.75 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,620.00 บาท คงเหลือ 2,521,504.25 บาท	58.76	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มติ และรายงานการประชุมที่มีความชัดเจน รวมถึง ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติงานได้ 2. รายงานการติดตามโครงการและการแสดงผล สถานภาพ การดำเนินงานของโครงการในลักษณะ User Interface ที่มี ประสิทธิภาพ สามารถรายงานจุดวิกฤติได้ทันทั่วทั้งที่ ลดความล่าช้า ในการบริหารโครงการ รวมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน การดำเนินงานภายใต้กลุ่มภารกิจพิเศษสนับสนุนโครงการ ระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)		1,620 บาท			อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63015 ⊖	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ปฐมพงศ์ / สบท.) งบที่ได้รับ 23,712,094.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 119,900.00 บาท, เงินรายได้ 23,556,884.00 บาท, และ เงินบริหารความเสี่ยง 35,310.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 22,005,634.50 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 852,870.00 บาท คงเหลือ 853,589.50 บาท	92.80	96.27	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลผลิตที่ได้รับ มีความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการให้บริการของ ระบบ Service (สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับและสำเร็จคล่องตามเป้าหมาย)
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร องค์กร 2. ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 3. การจดทะเบียน AS Number ในนามของ สทอภ		316,800 บาท 465,450 บาท 70,620 บาท			เลขที่สัญญา 5/2563 ลว. 29 พ.ย. 62 วงเงินในสัญญา 792,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63016 ●	แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (เศรษฐา / ผกส.) งบที่ได้รับ 240,500.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 240,500.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 97,745.06 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 142,754.94 บาท	40.64	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. ตรวจสอบร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ. และให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 80 เรื่อง 2. ตรวจสอบร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้ความเห็นทางด้านสัญญา ไม่ต่ำกว่า 50 เรื่อง 3. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ผกส. ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง
63017 ●	แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผสทอภ. (เวียร์เชียร์ / CEO Team) งบที่ได้รับ 1,603,700.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 256,500.00 บาท, เงินรายได้ 1,342,200.00 บาท, และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 5,000.00 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 886,385.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 717,315.00 บาท	55.27	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ ข้อสั่งการของ ผู้อำนวยการ สำหรับให้หน่วยปฏิบัติภายในนำขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สทอภ. (จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาและการสนับสนุนภารกิจของ ผสทอภ. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร, เบิก/จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ คณะทำงาน CEO Team)
63020 ⊖	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (มาลินี / สบห.) งบที่ได้รับ 7,076,421.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 6,932,405.00 บาท, เงินรายได้ 101,016.00 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 20,000.00 บาท และเงินบริหารความเสี่ยง 23,000.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 6,559,208.84 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 140,244.90 บาท คงเหลือ 376,967.26 บาท	92.69	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้อย่างพอเพียง 2. ครุภัณฑ์ของสำนักงานมีสภาพพร้อมใช้ 3. มียานพาหนะให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ 4. อาคารและสถานที่ สะอาดและปลอดภัย 5. ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการ อวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)		90,040.50 บาท			เลขที่สัญญา 113/2563 ลว. 28 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 90,040.50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 ส.ค. - 12 ต.ค. 63: อยู่ระหว่างซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63
	2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		50,204.40 บาท			เลขที่สัญญา 6/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 50,204.40 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						ขั้นตอนการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63022 ●	แผนงานตรวจสอบภายใน (ศัญญาภัทร์ / สตส.) งบที่ได้รับ 661,400.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 451,200.00 บาท, เงินรายได้ 210,200.00 บาท)	ผอ.สตส.	จ่ายจริง 265,912.50 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 395,487.50 บาท	40.20	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. การตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ (ตรวจสอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 24 รายงาน) 2. การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายจำนวน 13 รายงาน) 3. งานอื่นๆ (รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 6 รายงาน)
63023 ○	แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (พนิดา / สบห.) งบที่ได้รับ 217,422,753.74 บาท (เงิน พ.ร.บ. 189,814,670.00 บาท, เงินรายได้ 7,338,400.00 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 14,153,400.00 บาท, เงินทุน 5,996,180.00 บาท, เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 20,103.74 บาท และ เงินเครดิตภาษี 100,000.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 214,566,580.60 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 626,750.00 บาท คงเหลือ 2,229,423.14 บาท	98.69	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 ผลผลิตที่ได้รับ 1. การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ 2. การรับจ่ายเงิน เช่น ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และจ่ายชำระหนี้ 3. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน 4. การตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ ตรวจสอบระเบียบการขออนุมัติค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบสัญญาเงินและเอกสารส่งใช้เงินยืม, เบิกจ่ายเงินงบประมาณ, จัดทำคำขอ ผกค. และรายงานผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงิน
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบัญชี		600,000 บาท			เลขที่สัญญา 19/2563 ลว.7 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 13 พ.ค. 63 -31 มี.ค. 64 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 64
	2. จัดจ้างตรวจสอบรายงานสภาพเงินรายได้และเงินทุน สำหรับรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563		26,750 บาท			เลขที่สัญญา 63/2563 ลว.14 ก.พ. 63 วงเงินในสัญญา 107,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 ก.พ. - 31 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63024 ⊖	แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล (สุกันยา / สบท.) งบที่ได้รับ 5,147,737.61 บาท (เงิน พ.ร.บ. 4,746,241.71 บาท, เงินกองทุนสวัสดิการ 37,500.00 บาท, เงินบริหารความเสี่ยง 94,962.50 บาท, และเงินรายได้ตามอำนาจ สทอภ. 269,033.40 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 4,996,404.52 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 34,133.00 บาท คงเหลือ 117,200.09 บาท	97.06	98.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ยกเว้นกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถจัดได้ภายในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ (ซีใหม่) 180 คน 3. บุคลากร สทอภ. ได้รับการพัฒนา 219 ราย จาก 94 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรภายใน (In-house Training) จำนวน 24 หลักสูตร และหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public Training) จำนวน 68 หลักสูตร 4. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดประชุม - คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สทอภ. 7 ครั้ง - คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล จำนวน 5 ครั้ง - คณะอนุกรรมการ CG-CSR จำนวน 12 ครั้ง 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สทอภ. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผน 6. บุคลากร สทอภ. เข้าร่วมกิจกรรม SMART OFFICE ดำเนินการได้ตามแผน ยกเว้นกิจกรรมการปรับโครงสร้าง สทอภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และกำหนดเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ต่อไป
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ค่าวัสดุสำนักงาน ในการจัดทำสายคล้องบัตรพร้อมคลิปแบบตลับสายยัด (โยโย่) และซองหนังสำหรับบุคลากร สทอภ.		34,133 บาท			ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63
63030 ⊖	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สรทัศน์ / สยศ.) งบที่ได้รับ 3,055,312.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,078,612.00 บาท และ	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 1,468,930.50 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,457,190.00 บาท คงเหลือ 129,191.50 บาท	48.08	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. เผยแพร่ประเด็นข่าว 1,167 ครั้ง 2. ไม่มีการชี้แจงประเด็นที่เป็นข่าวให้กับสำนักโฆษก สำนัก

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	เงินรายได้ 1,976,700.00 บาท)					เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ 3. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร 3 กิจกรรม 4. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานส่งเสริมคุณค่าการสื่อสารภายในองค์กร 7 กิจกรรม 5. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสู่ภายนอก ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร 8 กิจกรรม
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน NGT		449,000 บาท			เลขที่สัญญา 91/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 449,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 มิ.ย. 63 - พ.ย. 63 (150 วัน) : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63
	2. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตรายงานประจำปี		350,000 บาท			เลขที่สัญญา 90/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 350,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 22 พ.ค. - พ.ย. 63 (180 วัน) : บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63
	3. จัดทำข้อมูลบทบาทและภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นองค์กร		347,750 บาท			เลขที่สัญญา 100/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 347,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับถัดจากตรวจรับฯ : อยู่ระหว่างให้บริษัทปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ม.ค. 64
	4. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ rebrand		265,500 บาท			เลขที่สัญญา 29/2563 ลว. 9 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 295,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63
	5. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร		44,940 บาท			เลขที่สัญญา 15/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 269,640 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
63049 ⊖	แผนงานพื้นฐานบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (วรรณวีร์ / สอว.) งบที่ได้รับ 45,961,506.37 บาท (เงิน พ.ร.บ. 28,530,000.00 บาท, เงินรายได้ 12,623,400.00 บาท, เงินบริหารความเสี่ยง 2,258,250.37 บาท, เงินทุน 932,000.00 บาท, และ เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 1,617,856.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 43,955,814.16 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 749,000.00 บาท คงเหลือ 1,256,692.21 บาท	95.64	99.80	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ 1. สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้สำเร็จคล่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการตามที่คุณบริหารและเจ้าหน้าที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน) 2. สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องความพร้อมใช้งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน)
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ (ซ่อมแซมพื้นคอนกรีต คัดฟ้าและผนังอาคาร SI)		749,000 บาท			เลขที่สัญญา สอว.17/2563 ลว.20 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 749,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ส.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63
63052 ●	แผนงานบริหารและสารบรรณ (สุรศักดิ์ / สบห.) งบที่ได้รับ 1,155,995.00 บาท (เงิน พ.ร.บ. 1,017,995.00 บาท และ เงินรายได้ 138,000.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 1,032,424.50 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 123,570.50 บาท	89.31	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ 1. รับ-ส่งเอกสารภายใน-ภายนอก 2. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 3. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีและพิธีการ 4. จ้างเหมาบริษัทส่งเอกสารภายนอก 5. ประสานการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 6. มีกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายให้หน่วยงานต่างๆ
63068 ●	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (ปฐมพงศ์ / สบห.) งบที่ได้รับ 11,378,124.00 บาท (เงินทุน 11,378,124.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 11,378,124.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ - บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ ความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการให้บริการของระบบ Service ได้แก่ 1. จ้างเหมาบริการจัดการระบบบัญชีรายชื่อ (AD) 2. จัดซื้อระบบ Access Control 3. จ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
63075 ⊖	โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด (แพรวพร / สยศ.) งบที่ได้รับ 4,626,545.29 บาท	ผสทอภ.	จ่ายจริง 59,974.50 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 738,570.82 บาท	1.30	100.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแผนงาน/

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	(เงิน พ.ร.บ. 4,626,545.29 บาท)		คงเหลือ 3,827,999.97 บาท			โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการรายการรายปี จำนวน 63 รายการ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโซนนิทรรศการ Space Inspirium และวัสดุภายใน SI เพื่อใช้ในภารกิจเตรียมต้อนรับคณะ รมว.อว.		738,570.82 บาท			ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63126 ⊖	แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จุฬามาต / CEO) งบที่ได้รับ 84,000.00 บาท (เงินรายได้ 84,000.00 บาท)	ผสทอภ.	จ่ายจริง 14,125.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 4,218.25 บาท คงเหลือ 65,656.75 บาท	16.82	75.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ผลผลิตที่ได้รับ รายงาน/สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ ได้แก่ สรุปการศึกษาฐานศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) และศูนย์ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS ของกรมแผนที่ทหาร โดยมี รศ. พาสีทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อว. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาฐาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 11 หน่วยงาน จำนวน 29 คน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) เยี่ยมชมการสาธิตการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล CORS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่างๆ
	กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ค่ารับรองและพิธีการ ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุม คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิสารสนเทศ					อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63
63127 ●	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม (สรทัศน์ / สยศ.) งบที่ได้รับ 81,800.00 บาท (เงินรายได้ 81,800.00 บาท)	รอง ผสทอภ. (พีร์)	จ่ายจริง 35,750.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 46,050.00 บาท	43.70	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตที่ได้รับ สทอภ. มีมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ. แล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 (ครั้งที่ 11/2563) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านการ

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
โครงการเพื่อการหารายได้ (8 โครงการ)						
63072 ⊖	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของกลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (กพล.) งบที่ได้รับ 16,909,401.38 บาท (เงินเบิกจ่ายแทนกัน 8,073,740.89 บาท, เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 545,313.75 บาท และ เงินสำรองรายได้ 8,290,346.74 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 8,390,962.25 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,416,869.80 บาท กันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 2,225,550.82 บาท คงเหลือ 4,876,018.51 บาท	49.62	86.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล TCS (สำหรับมือถือ) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TCS (505,575 บาท) 2. ค่าจ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ (Web Application) และ แอปพลิเคชันชุมชนไม่มีค่า-ป่าครอบครัว (Mobile Application) (241,500 บาท) 3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (399,794.80 บาท) 4. จ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (270,000 บาท) กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 5. เพื่อสนับสนุน สพอ. ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์สมนาคุณ (204,793.88 บาท) 6. โครงการจัดทำแผนที่มาตรฐานประกอบการเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณกลุ่มเกาะประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (115,178.17 บาท) 7. โครงการจัดทำแผนที่อ่อนไหวของทรัพยากรต่อมลพิษจากน้ำมัน บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (85,877 บาท) 8. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันชุมชนไม่มีค่า - ป่าครอบครัว เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของ

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						<p>สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (288,663.72 บาท)</p> <p>9. โครงการตรวจสอบและจัดทำแผนที่ข้อมูลสำรวจการใช้ที่ดินรายแปลงเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร จ. น่าน ปี 2563 (193,791.29 บาท)</p> <p>10. โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) (1,322,200.96บาท)</p> <p>11. งานสำรวจรังวัดข้อมูลเหมืองหินอุตสาหกรรม ของ บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด บริเวณพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (15,045.80 บาท)</p>
63073 ⊖	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการ ภายใต้สถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (สอร.) งบที่ได้รับ 10,354,618.04 บาท (เงินเบิกจ่ายแทนกัน 6,955,830.00 บาท, และ เงินสำรองรายได้ 3,398,788.04 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงศฤทธิ)	จ่ายจริง 3,247,035.26 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 5,247,125.00 บาท กันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท คงเหลือ 860,457.78 บาท	31.36	86.00	<p>คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน</p> <p>1. สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินโครงการงานรับส่งสัญญาณ 7.3 เมตร กับบริษัท SSC สวีเดน ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 - ค่าใช้สอยสำหรับติดตั้ง บำรุงรักษาระบบและสาธารณูปโภค (361,125.00 บาท)</p> <p>2. ค่าเช่าสถานที่ ภายใต้สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินการโครงการ S3EE (10,000.00 บาท)</p> <p>3. ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้แก่</p> <p>1) จ้างเหมาพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ (Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล (820,000 บาท)</p> <p>2) จ้างเหมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (5G) ที่เชื่อมต่อระบบเกษตรอัจฉริยะ (3,000,000 บาท)</p> <p>3) จ้างบริการทางวิชาการโครงสร้างพื้นฐานการบริการ</p>

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
						ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (5G) ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (1,000,000 บาท) 4) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (56,000 บาท) กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 5) จ้างบริการทางวิชาการพื้นที่ต้นแบบการทดสอบนวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับ (1,000,000 บาท)
63074 ⊗	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สวภ.) งบที่ได้รับ 1,590,000.00 บาท (เงินสำรองรายได้ 1,590,000.00 บาท)	ป.อ.สวภ. (ดำรงคฤทธิ)	จ่ายจริง 1,202,567.83 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 69,100.00 บาท คงเหลือ 318,332.17 บาท	75.63	99.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จ้างเหมาจัดพิมพ์แผนที่ Gridmap และอำนวยความสะดวกการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Gridmap (1 งวด ภายใน ต.ค. 63) (69,100.00 บาท)
63076 ●	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของสถาบันนิเวศองค์ความรู้ (สพอ.) งบที่ได้รับ 1,356,430.00 บาท (เงินเบิกจ่ายแทนกัน 490,500.00 บาท, เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 46,880 บาท และ เงินสำรองรายได้ 819,050 บาท)	ป.อ.สวภ. (ดำรงคฤทธิ)	จ่ายจริง 1,280,002.11 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 76,427.89 บาท	94.37	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63130 ●	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (สพภ.) งบที่ได้รับ 242,500.00 บาท (เงินสำรองรายได้ 242,500.00 บาท)	ป.อ.สวภ. (ดำรงคฤทธิ)	จ่ายจริง 242,500.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ - บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63134 ⊗	โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สพอ.) งบที่ได้รับ 46,080,000.00 บาท (เงินเบิกจ่ายแทนกัน 45,351,000.00 บาท,	ป.อ.สวภ. (ดำรงคฤทธิ)	จ่ายจริง 33,538,043.37 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 11,763,449.40 บาท กันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 520,000.00 บาท คงเหลือ 258,507.23 บาท	72.78	96.00	คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำในรูปแบบดิจิทัล (11,016,000.00 บาท) 2. จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตหลักสูตรออนไลน์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (359,969.40 บาท)

รหัสโครงการ	โครงการ/แผนงาน (ผู้รับผิดชอบ) (งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด)	ผู้บังคับบัญชาตามภารกิจ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	ผลผลิตที่ได้รับ / กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
	และ เงินสำรองรายได้ 729,000.00 บาท)					<p>3. จัดจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และผลิตหลักสูตรออนไลน์ (179,900.00 บาท)</p> <p>4. ค่าจ้างเหมาติดตามความคืบหน้าของโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน (207,580.00 บาท)</p> <p>กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน</p> <p>5. จ้างเหมาตรวจสอบฐานข้อมูลรายจังหวัดจากโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน (300,000.00 บาท)</p> <p>6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถอดบทเรียน สรุป ติดตาม และ ประเมินผลโครงการ (120,000.00 บาท)</p> <p>จัดจ้างทำระบบ GISTDA FAMILY เพื่อพิจารณาทักษะและสร้างอาชีพ (100,000.00 บาท)</p>
63135 ⊖	โครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อประมาณการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ (สปก.) งบที่ได้รับ 200,000.00 บาท (เงินเบิกจ่ายแทนกัน 200,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง - บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน 189,999.90 บาท คงเหลือ 10,000.10 บาท	0.00	80.00	<p>คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 2/2564</p> <p>กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน</p> <p>จ้างเหมาดำเนินงานโครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลดาวเทียมจากสถานตรวจวัดอากาศประมาณการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ (189,999.90 บาท) อยู่ระหว่างการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อประมาณการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 64 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน ก.พ. 64</p>
63136 ●	โครงการเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ (สปก.) งบที่ได้รับ 21,000.00 บาท (เงินสำรองรายได้ 21,000.00 บาท)	ป.รอง ผสทอภ. (ตติยะ)	จ่ายจริง 12,745.00 บาท กันเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน - บาท คงเหลือ 8,255.00 บาท	60.69	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)**

องค์การมหาชน	ประสิทธิผล	การ ผลักดัน ยุทธศาสตร์	ประสิทธิภาพ	การ ตอบสนอง ต่อ ประชาชน	การ ควบคุมดูแล กิจการฯ	สรุปผล ประเมิน องค์การ	คะแนน ITA*
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	ดี	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก (92.17)	77.68 ระดับ B

สรุปผลการประเมินระดับองค์การ

- ระดับดีมาก** หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
- ระดับดี** หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน
- ระดับพอใช้** หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน
- ระดับต้องปรับปรุง** หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน

หมายเหตุ * ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

** ผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนน ระดับ A

ระดับ	คะแนน
AA	95.00 - 100
A	85.00 – 94.99
B	75.00 – 84.99
C	65.00 – 74.99
D	55.00 – 54.99
E	50.00 – 49.99
F	0 – 49.99

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน

ประสิทธิผล	การผลักดันยุทธศาสตร์	ประสิทธิภาพ	การตอบสนองต่อประชาชน	การควบคุมดูแลกิจการฯ	สรุปผลประเมิน (ภาพรวม)	คะแนน ITA
ดี	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก (92.17)	77.68

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจากค่าเป้าหมาย)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ							
1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (WCY2020)	5	37	35	33	39	0	0
1.2 จำนวนหน่วยงานที่นำภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ระดับประเทศ	15	3 หน่วยงาน	5 หน่วยงาน	7 หน่วยงาน	8 หน่วยงาน	100	15
1.3 ความสำเร็จในการนำข้อมูลไฟฟ้าและมลพิษทางอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ (MOU)	5	1 MOU	2 MOU	3 MOU	4 MOU	100	5
1.4 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง	5	1 ระบบฐานและมีการติดตามเป็นระยะ	ระบบสามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยได้	มีระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ	มีระบบการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ	100	5
1.5 ความสำเร็จการเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ประกอบด้วย	15						
1.5.1การสรรหาคน (THEOS Roadmap)	5	-	สรรหาบุคลากรครบ 7 คน ตามเวลาที่กำหนด	สรรหาบุคลากรครบ 7 คน เร็วกว่าเวลาที่กำหนด	สรรหาบุคลากรครบ 7 คน ตามเวลาที่กำหนด	75	3.75
1.5.2การพัฒนากำลังคน	4						
(1) การพัฒนากำลังคนด้านดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน	(1)	-	บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติและฝึกศึกษาครบ ตาม	บุคลากรได้ปฏิบัติงานพัฒนาเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนงานปกติ	บุคลากร ได้รับการฝึกปฏิบัติและฝึกศึกษาครบ ตามหลักสูตรที่กำหนด รวมทั้งได้ร่วม	100	1

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมาย ขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจาก ค่าเป้าหมาย)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
			หลักสูตรที่กำหนด ในปี 2563	(ร่วมพัฒนาและ จัดทำ 3 rd Payload)	พัฒนาและจัดทำ 3 rd Payload		
(2) การพัฒนาบุคลากร เพื่อการใช้งานระบบ Application/Solution ที่ จัดหาภายใต้โครงการฯ (ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด)	(1)	เกณฑ์ขอ ปรับใหม่ -	1	1 หลักสูตร+การ เตรียมความพร้อม สำหรับจัดอบรม โดยมีเนื้อหา หลักสูตร จำนวน คน สถานที่ ครบ ทั้ง 5 หลักสูตร	ปรับเกณฑ์/แผนส่ง ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 และได้ ดำเนินการปรับ แผนการ ดำเนินงาน สำหรับ หลักสูตรที่เหลือไป ดำเนินการต่อใน ปีงบประมาณ 2564	NA	-
		เกณฑ์เดิม อบรม 4 หลักสูตร	อบรม 5 หลักสูตร	อบรม 6 หลักสูตร			
(3) การเตรียมความ พร้อมบุคลากร ด้าน Application/Solutions และ ด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP)	(1)	-	อบรม 2 หลักสูตร + มีผลสัมฤทธิ์ รายบุคคลผ่าน เกณฑ์ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	อบรม 2 หลักสูตร + มีผลสัมฤทธิ์ รายบุคคลผ่าน เกณฑ์ประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	1.อบรม ภาษาอังกฤษ มีผู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 72 2.อบรม policy lab โดยมีผู้ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	75	0.75
(4) การพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องในภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน (Module) (ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด)	(1)	เกณฑ์ขอ ปรับใหม่ 2	3	4	ปรับเกณฑ์/แผนส่ง ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ไม่ สามารถจัด ฝึกอบรมได้ครบ ทั้ง 4 โมดูล และหลักสูตรที่เปิด ให้บริการเป็น หลักสูตรที่เน้น ปฏิบัติการ	NA	-
		เกณฑ์เดิม 2 Module และมีการ อบรมภายใต้ หลักสูตรแต่ ละ	3 Module และมีการอบรม ภายใต้หลักสูตร แต่ละ Module อย่างน้อย 1 หลักสูตร	4 Module และมีการอบรม ภายใต้หลักสูตร แต่ละ Module อย่างน้อย 1 หลักสูตร			
5.3 การรักษาและอ้าง บุคลการภารกิจโครงการ THEOS-2 และเทคโนโลยี ระบบดาวเทียมของประเทศ	3	-	บุคลากรปฏิบัติ ภารกิจพิเศษ ไม่มี การลาออกหรือให้ ออก ระหว่างการ ทดลองงาน (อัตรา การออกระหว่าง ทดลองงานร้อยละ 0)	บุคลากรปฏิบัติ ภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานและฝึก ศึกษาต่อเนื่อง โดยไม่ถูกส่งกลับ ระหว่างการฝึก ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563	บุคลากรปฏิบัติ ภารกิจพิเศษ ปฏิบัติงานและฝึก ศึกษาต่อเนื่อง โดย ไม่ถูกส่งกลับ ระหว่างการฝึก ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563	100	3

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจากค่าเป้าหมาย)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
5.4 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน	3						
5.4.1 การบำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร เพื่อรองรับการปรับปรุง (Upgrade) โดยบริษัท Airbus	2	มีสัญญาบำรุงรักษาระบบงานฯ จำนวน 2 สัญญา	เป้าหมายขั้นต่ำ + ผ่านการประเมินเพื่อปรับปรุงระบบงานฯ จำนวน 1 ระบบ	เป้าหมายขั้นสูง + ผ่านการประเมินเพื่อปรับปรุงระบบงานฯ จำนวน 2 ระบบ	บำรุงรักษาระบบงานสายอากาศย่านความถี่ X-band 13 เมตร จำนวน 2 งานสายอากาศ (2 สัญญา) เพื่อรองรับการปรับปรุงให้เป็นไปตามสัญญาโครงการ THEOS 2 โดยผ่านการประเมินจากบริษัท Airbus แล้ว	100	2
5.4.2 การพัฒนาพื้นที่ (Working Space) เพื่อเตรียมรองรับการติดตั้ง Innovative Singularity Platform และการทำงานของบุคลากร	1	ปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ	เป้าหมายขั้นต่ำ + บุคลากรจำนวน 120 คน สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้	เป้าหมายมาตรฐาน + ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจรับระบบ ISP ดำเนินการแล้วเสร็จ	-บุคลากร 120 คน เข้าใช้พื้นที่ตั้งแต่ 5.ค.2562 -ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับ ISP เรียบร้อย	100	1
องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ							
2.1 ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่	5	นำข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างน้อย 1 ด้าน และมีชุมชนได้รับประโยชน์อย่างน้อย 500 ชุมชน	นำข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างน้อย 2 ด้าน และมีชุมชนได้รับประโยชน์อย่างน้อย 600 ชุมชน	นำข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการ THEOS-2 ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างน้อย 2 ด้าน และมีชุมชนได้รับประโยชน์อย่างน้อย 700 ชุมชน	นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้รับภายใต้โครงการฯ สนับสนุน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสรรที่ดิน และด้านการเกษตร รวม 768 ชุมชน	100	5
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ							
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน	5	-	ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	• ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และค่าใช้จ่ายด้าน	มีหนังสือแจ้งขอยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สทอภ. ประจำปี	NA	-

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจากค่าเป้าหมาย)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
				บุคลากรจริง ไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สป.	2563 อว 5308/1924 ลง วันที่ 16 กันยายน 2563		
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการให้บริการขององค์กรมหาชน							
3.2.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท)	5	98.18	100.44	110	114,871,430	100	5
3.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารโครงการบนฐานคุณค่า (Value Base PBM)	5	มีโครงการที่จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ 2564 อย่างน้อยร้อยละ 40 นำไปใช้	- มีโครงการที่จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ 2564 อย่างน้อยร้อยละ 50 นำไปใช้ - ทุกโครงการที่มีมูลค่าโครงการสูง (เกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป) ต้องวิเคราะห์	- มีการวัดความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม โดยใช้ SROI - มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ.	โครงการ/กิจกรรม ใช้ SROI ในการประเมินมูลค่าฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ.	100	5
3.2.3 ความสำเร็จในการให้บริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด)	10	เกณฑ์ขอปรับใหม่ -	1) ยื่นขอรับรองมาตรฐาน และ 2) มีจำนวนให้บริการทดสอบเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมหรือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Aerospace 250 ชิ้น	1) ยื่นขอรับรองมาตรฐาน/มี กระบวนการตรวจสอบ ภายใน/ส่งเอกสาร ตรวจสอบประเมิน และ 2) มีจำนวนให้บริการทดสอบเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมหรือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Aerospace มากกว่า 250 ชิ้น	ปรับเกณฑ์/แผนส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดผลกระทบ 2 ส่วน ได้แก่ การเดินทางมา audit ของคณะกรรมการประเมินจากต่างประเทศ และ ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของอุตสาหกรรม Aerospace ทั้งระบบ จึงทำให้ไม่สามารถได้มาตรฐานภายใน ก.ย. 63 (จำนวนให้บริการ 268 ชิ้น)	NA	-
		เกณฑ์เดิม -	1)ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 ระบบ 2)มีจำนวนให้บริการทดสอบเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม หรือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Aerospace 1,000 ชิ้น	1)ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 ระบบ 2)มีจำนวนให้บริการทดสอบเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมหรือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Aerospace มากกว่า 1,000 ชิ้น			
องค์กรประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน							
4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal	5	องค์การมหาชนส่งข้อมูลสำคัญขององค์การมหาชนมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วน	องค์การมหาชนส่งข้อมูลสำคัญขององค์การมหาชนมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วนตามรายการ	องค์การมหาชนส่งข้อมูลสำคัญขององค์การมหาชนมายังสำนักงาน ก.พ.ร. ครบถ้วนตามรายการที่	สทอภ. ส่งข้อมูลสำคัญให้สำนักงาน กพ.ร. ครบถ้วนตามรายการที่	100	5

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน			ผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมาย ขั้นสูง (100)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้ (เทียบจาก ค่าเป้าหมาย)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
		ตามรายการที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 1)	ที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)	กำหนด ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3)	กำหนด (ข้อมูลกลุ่ม 1 2 และ 3)		
4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน	5	ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละ 50 - 74.99	ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละ 75 - 89.99	ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 88.72 และผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	100	5
องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน							
5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	15	ร้อยละ 100			ผ่าน (100) ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ประเด็น	100	15
คะแนนรวม							92.17
สรุปผลการประเมินระดับองค์กร							ดีมาก

รายงานผลตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด สกป.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย (ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด)	ร้อยละ	-	=	-	=	-	30	50	55	ออกแบบ AIP พื้นที่ EEC และ น่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	55	ผสทอก. ๖๒
ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	50	718.7	50 ล้านบาท	718.7	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	950	1,677.10	950 ล้านบาท	1,677.10	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวข้อง	ราย	-	=	-	5	-	=	-	=	5 ราย	5	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนด้านนโยบาย	นวัตกรรม	-	=	-	=	-	1	5	5	5 นวัตกรรม	5	สวก.
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	=	-	=	-	7	25	25	25 เรื่อง	25	สปก. สผก. สพอ. สวก.
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	91	-	242	-	401	500	500	500 เรื่อง	500	สปก.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ (ขอปรับเป้าตัวชี้วัด)	หลักสูตร	-	6	-	11	-	12	-	13	15 หลักสูตร	13	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (ปรับเป้าหมาย)	ร้อยละ	12.50	26.85	25.00	30.63	37.50	41.17	50	44.50	ร้อยละ 50	44.5	ผลทอก. รอ.2
ตัวชี้วัดที่ 10 ห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้น้ำหนักถ่วง	ห้องปฏิบัติการ	-	=	-	=	-	=	1	1	1 ห้องปฏิบัติการ	1	สวก.
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนชุมชน/พื้นที่นำระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลไปใช้ประโยชน์	พื้นที่	-	=	-	=	-	=	3	3	3 พื้นที่	3	สปก.
ตัวชี้วัดที่ 12 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง (2a, 2b) ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน (ปรับค่าเป้าหมาย)	สนามบิน	-	=	-	=	-	=	-	1	1 สนามบิน	1 ระบบสนับสนุน	สวก.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์ทดสอบ Aerospace ที่ได้รับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (ภายใต้ การจัดตั้ง ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)	ศูนย์	-	=	-	=	-	=	1	1	1 ศูนย์	1	สร.

รายงานผลตามตัวชี้วัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด อว.)

ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		เป้า หมาย ทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัด เก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน บุคลากรด้านการวิจัยและ พัฒนาแบบทำงานเต็ม เวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน	-	<u>15</u>	-	=	-	=	11	<u>11</u>	11	<u>15</u>	สบท. ฝพท. สวท.
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน บุคลากรที่ทำงานด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คน	-	<u>126</u>	-	=	-	=	110	<u>130</u>	110	<u>130</u>	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้า รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม	คน	-	<u>143,214</u>	-	<u>135,897</u>	-	<u>21,846</u>	130,000	<u>19,442</u>	130,000	<u>320,399</u>	สอธ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน นักวิจัยที่มีการ แลกเปลี่ยนกับ ต่างประเทศ	ราย	-	=	-	<u>12</u>	-	=	12	=	12	<u>12</u>	สบท.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน หลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพัฒนาและสามารถ มอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	1	<u>1</u>	-	=	-	=	-	=	1	<u>1</u>	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการนำ แผน/นโยบาย/มาตรการไป ใช้ประโยชน์ในการกำกับ แก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	-	=	-	=	-	<u>25</u>	25	=	25	<u>25</u>	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 7 ผลคะแนน เฉลี่ยระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ใน การดำเนินงานของ อว.	คะแนน	-	=	-	=	-	=	84	<u>77.68</u>	84	<u>77.68</u>	ฝพท.
ตัวชี้วัดที่ 8 เรื่องที่เกิด จากการสร้างความ ร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	<u>3</u>	-	<u>1</u>	-	=	3	<u>1</u>	3	<u>5</u>	สยศ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 61)		ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 62)		ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 62)		ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 62)		เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน 4 ไตรมาส	ผู้จัดเก็บข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน			
ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	=	-	=	-	=	1,071	<u>1,318.37</u>	1,071	<u>1,318.37</u>	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 10 บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	<u>7</u>	-	<u>2</u>	-	=	8	=	8	<u>9</u>	สวก. ผบว.
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	-	=	-	<u>10</u> (3 <u>ผลงาน</u>)	-	<u>13.33</u> (4 <u>ผลงาน</u>)	27	<u>27</u> (8 <u>ผลงาน</u>)	27	<u>27</u> (8 <u>ผลงาน</u>)	กพล.
ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)	ร้อยละ	-	<u>74.40</u>	-	<u>79</u>	-	<u>91</u>	80	<u>98</u>	80	<u>98</u>	ธอ.2
ตัวชี้วัดที่ 13 ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	-	=	-	<u>5</u>	-	=	15	<u>15</u>	15	<u>15</u>	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 14 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	<u>0.55</u>	-	<u>1.05</u>	-	<u>4.75</u>	4	<u>5.35</u>	4	<u>5.35</u>	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม (ปรับค่าเป้าหมาย)	ผลงาน	-	=	-	=	-	=	4	=	4	<u>2</u>	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 16 ชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	-	=	-	=	-	<u>2</u>	4	<u>2</u>	4	<u>4</u>	สปก.
ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	-	=	-	=	-	=	1	<u>1</u>	1	<u>1</u>	สปก.

ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/แผนงานที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี ทั้งหมด 56 โครงการ/แผนงาน ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ/แผนงาน และดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน ดังนี้

สัญลักษณ์ ● ดำเนินการแล้วเสร็จ (48 โครงการ/แผนงาน) ⊖ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (8 โครงการ/แผนงาน)

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (8 โครงการ/แผนงาน)								
1	59019 ⊖	กิจกรรมงานบริหารทั่วไปด้านงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	สบท. / มาลิน	280,489.80 (เงินทุน)	จ่ายจริง 197,992.80 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 82,497.00 บาท คงเหลือ - บาท	70.59	98.00	เป็นรายการจ้างเหมารถโฟร์วีล สัญญา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2564 ทอยเบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563
2	60015 ⊖	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติและโครงสร้างองค์การอวกาศ	สยศ. / ระวีวรรณ	426,930.00 (เงิน พ.ร.บ.)	จ่ายจริง - บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 426,930.00 บาท คงเหลือ - บาท	0.00	90.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : การจัดทำเล่มยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 (0.4269 ลบ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทอวกาศฯ ในยุทธศาสตร์ ที่ 1-4 ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นจาก สศช. แล้ว ยังเหลือการปรับแก้ไขในยุทธศาสตร์ที่ 5-8 และต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว จะดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563
3	60044 ⊖	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สทอภ. ประจำปี 2561-2564	สยศ. / ชาคริต	348,606.00 (เงินรายได้)	จ่ายจริง - บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 348,606.00 บาท คงเหลือ - บาท	0.00	97.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563
4	61110 ⊖	โครงการงานรื้อถอน ขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ (WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ	กภด. / นวัตรณ	2,550,000.00 (เงินทุน)	จ่ายจริง 1,020,000.00 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 1,530,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	40.00	60.00	ล่าช้าเนื่องจาก : 1. บริษัทฯ มีหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างและเลื่อนการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
								<p>2. ป. รong ผสทอก. (ตติยะ) เห็นชอบ การขยายเวลา เริ่มดำเนินงาน โดยให้ บริษัท เข้าดำเนินการต่อตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป</p> <p>3. บริษัทส่งมอบและคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่าย งวดที่ 1 วงเงิน 1.02 ลบ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. บริษัทดำเนินการงวด 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ</p> <p>คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563</p>
5	61087 ⊗	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	ธอ.2 / บุญชูบ	47,319,613.08 (เงิน พ.ร.บ. 46,582,205 / และ เงินทุน 737,408.08)	จ่ายจริง 30,786,615.46 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 16,532,997.62 บาท คงเหลือ - บาท	65.06	90.16	<p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <p>1. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม : บริษัทส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 ล่าช้าเนื่องจาก 1) ขาดแรงงานในการดำเนินงาน 2) ขาดวัสดุเข้าโครงการ ได้แก่ Scupper Drain จำนวน 3 จุด สำหรับใช้ติดตั้งระบบระบายน้ำชั้น 4 ฐานงานดาวเทียม / เหล็กกำแพงกันดินและถนน, หินคลุก, ทราวยหยาบ, เหล็กตะแกรง WIRE MESH, รถบดอัดชั้นดินและชั้นหินคลุก และ วัสดุทรายหยาบและปูนปรับระดับ</p> <p>2. กิจกรรมดำเนินโครงการ วงเงิน 1.44 ลบ. ซึ่งเป็นเงินยืม ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจพิเศษ (สำหรับค่าเช่าและค่าที่พักเมืองกิลฟอร์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่าจะเคลียร์เงินยืม ในเดือนมีนาคม 2564</p> <p>คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564</p>
6	62061 ⊗	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา	ธอ.2 / บุญชูบ	2,890,000.00 (เงิน พ.ร.บ.)	จ่ายจริง - บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 2,890,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	0.00	5.00	<p>กิจกรรมที่ล่าช้า :</p> <p>การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (2.89 ลบ.) : ใช้สำหรับเบิกจ่ายงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการ 61087 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้</p> <p>คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563</p>

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
7	62067 ⊗	โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	ธอ.2 / บุญชู	4,602,994.50 (เงิน พ.ร.บ. 3,845,469.50 / และ เงินทุน 757,525.00)	จ่ายจริง 4,331,401.00 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 120,000.00 บาท คงเหลือ 151,593.50 บาท	94.10	95.00	กิจกรรมที่ล่าช้า : กิจกรรมดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นเงินยืม ของ น.ส.ปรีพริษา ไพรรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ (สำหรับค่าเช่าและค่าที่พัก เมืองกิลฟอร์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่าจะเคลียร์เงินยืม ภายในเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564
8	62050 ⊗	โครงการ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์บนคลาวด์ (GISTDA Portal On Cloud	สผก. / ยรรยง	9,606,585.43 (เงินทุน)	จ่ายจริง 9,589,925.53 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 16,659.90 บาท คงเหลือ - บาท	99.83	99.00	การจ้างเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ความเร็ว 200 Mbps. ระหว่าง สทอภ. กับ Colocation Data Center : อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 11/12 คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
2. โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ (48 โครงการ/แผนงาน)								
9	62062 ●	โครงการ EPS Frontier Research	สอร. / ดำรงค์ฤทธิ์	17,453,000.00	จ่ายจริง 17,453,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	62032 ●	โครงการ พัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3	สผก. / ตติยะ	6,705,404.00	จ่ายจริง 6,568,404.00 บาท คงเหลือ 137,000 บาท	85.61	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	62058 ●	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับนานาชาติ	สพอ. / ฐนิตา	888,889.00	จ่ายจริง 888,889.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	62015 ●	แผนงานส่งเสริมกิจกรรม สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจจาก Space Inspirium	สอร. / ศิริพัทธ์	419,350.00	จ่ายจริง 419,350.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	61012 ●	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเกษตรเชิงพื้นที่	สปภ. / ปกรณ์	1,235,850.00	จ่ายจริง 1,235,850.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
14	61032 ●	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน	กกด. / รฐปนรรษ์	575,250.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 575,250.00 บาท	0.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	62007 ●	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ของเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบัน	สปภ. / ปิยะวรรณ	9,601,910.00	จ่ายจริง 9,601,460.00 บาท คงเหลือ 450.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	62011 ●	โครงการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เขตเชิงพื้นที่และภัยพิบัติ	สปภ. / ศิริลักษณ์	4,812,321.35	จ่ายจริง 4,812,321.35 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	62063 ●	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร	สยศ. / สรทัศน์	2,619,200.00	จ่ายจริง 2,597,533.33 บาท คงเหลือ 21,666.67 บาท	99.17	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	60017 ●	โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	สผภ. / ยรรยง	7,803,000.00	จ่ายจริง 7,803,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	60058 ●	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ.	สบท. / สุรศักดิ์	63,493.80	จ่ายจริง 63,493.80 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	61111 ●	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สอร. / จตุรงค์	7,836,550.00	จ่ายจริง 7,836,550.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	62010 ●	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก	สปภ. / ชินตา	5,509,472.00	จ่ายจริง 5,169,535.66 บาท คงเหลือ 339,936.34 บาท	93.83	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	62022 ●	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย	สวภ. / ดำรงศุภี	1,669,000.00	จ่ายจริง 1,617,600.00 บาท คงเหลือ 51,400.00 บาท	96.92	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
23	62025 ●	โครงการศึกษาอุตสาหกรรม อวกาศในประเทศไทย	สอ. / จตุรงค์	1,862,230.00	จ่ายจริง 1,862,230.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	62027 ●	โครงการพัฒนาเครื่องมือ วางแผนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ ระยะที่ 5	สวท. / วสันชัย	686,000.00	จ่ายจริง 686,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	62034 ●	โครงการ พัฒนาดันแบบ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ ความปลอดภัยในการ เดินอากาศ ระยะที่ 2	สวท. / ศุภัชชา	34,063,490.00	จ่ายจริง 34,063,490 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	62037 ●	แผนงานระบบปฏิบัติการ ดาวเทียมภาคพื้นดิน	กทศ. / ธูปนรินทร์	6,694,911.02	จ่ายจริง 6,186,671.18 บาท คงเหลือ 508,239.84 บาท	92.41	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	62041 ●	แผนงานบริหารและการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	สยศ. / ระวีวรรณ	1,077,273.27	จ่ายจริง 1,077,273.27 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	62044 ●	แผนงานการบริหารกฎหมาย และสัญญา	ฝกส. / เชษฐา	40,660.00	จ่ายจริง 40,660.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	62066 ●	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับอาคารควบคุม ดาวเทียม	สอ. / จตุรงค์	52,201,304.00	จ่ายจริง 52,201,304.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	62069 ●	แผนงานสนับสนุนและ ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม งานกำกับ ติดตาม และ ประสานภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับ THEOS-2	CEO Team / เวียร์เธียร์	400,000.00	จ่ายจริง 400,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	59007 ●	แผนงานบริหารจัดการ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม อวกาศ	สอ.	1,980,000.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 1,980,000.00 บาท	0.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
32	60034 ●	แผนงานการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ	สพอ. / ฐนิตา	150,230.05	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 150,230.05 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	60042 ●	แผนงานพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคล	สบท. / สุกัญญา	125,190.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 125,190.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	60059 ●	กิจกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศอุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ	สอร.	3,950.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 3,950.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	61026 ●	โครงการการจัดทำภูมิ สารสนเทศพื้นฐานเพื่อการ บริการ	สผภ./ ธัญวรัตน์	2,262,500.00	จ่ายจริง 2,262,500.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	61035 ●	แผนงานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	สบท. / สุกัญญา	15,000.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 15,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	61051 ●	โครงการพัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลาง ของประเทศ ระยะที่ 2	ฝพภ. / เวียรเชียร	316,000.00	จ่ายจริง 316,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	61070 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก ยุทธศาสตร์	สยศ. / อุปนันท์	4,000.00	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ 4,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	61080 ●	แผนงานการบริหารและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สตอภ.	สยศ. / ระวีวรรณ	1,900,000.00	จ่ายจริง 1,899,000.00 บาท คงเหลือ 1,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	62002 ●	แผนงานการปฏิบัติงาน เลขานุการของคณะ กรรมการบริหาร	ผลค. / ณัฐนันท์	16,050.00	จ่ายจริง 16,050.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	62013 ●	โครงการ การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ สอร.	สอร. / ณิชาพร	350,487.06	จ่ายจริง 347,563.06 บาท คงเหลือ 2,924.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเดือนปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
42	62017 ●	โครงการศูนย์ทดสอบ มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ ระยะที่ 2	สอ. / ณัฐวัฒน์	515,200.00	จ่ายจริง 515,039.18 บาท คงเหลือ 160.82 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	62018 ●	โครงการ ส่งเสริมการใช้งาน ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนส่งเสริม GNSS Service)	สอ. / ศิริพัทธ์	63,700.00	จ่ายจริง 63,700.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	62019 ●	โครงการพัฒนากลุ่ม เครือข่ายอุตสาหกรรมด้าน Aerospace เพื่อสร้าง ศักยภาพใน Global Value Chain	สอ. / พรเทพ	1,319,550.00	จ่ายจริง 1,319,550.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	62038 ●	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะ	สบท. / มาลิน	9,362.50	จ่ายจริง 9,362.50 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	62042 ●	แผนงานตรวจสอบภายใน	สตส. / ดวงรัตน์	6,955.00	จ่ายจริง 6,955.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	62043 ●	กิจกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศกลาง	สบท. / สุรศักดิ์	745,050.00	จ่ายจริง 745,050.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	62048 ●	แผนงานสนับสนุนติดตามผล การดำเนินงานและ บริหารงานทั่วไปหน่วยงานฯ	สผก. / กัลยาณี	14,766.00	จ่ายจริง 14,766.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	62053 ●	โครงการส่งเสริมธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและ มูลค่าเพิ่ม	สพธ. / กมลมาศ	716,070.00	จ่ายจริง 716,070.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	62059 ●	แผนงานส่งเสริม ประสาน ผลักดัน ขับเคลื่อนการ	สปอ. / ฐนิตา	49,768.91	จ่ายจริง 49,768.91 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัส	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	วงเงิน กันเหลือในปี	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 2563)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		พัฒนาขีดความสามารถ เชื่อมโยงเครือข่ายทาง วิชาการและต่อยอด นวัตกรรม						
51	62064 ●	โครงการสร้างคุณค่าการทำงาน ให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การ สื่อสาร	สยศ. / สรทัศน์	455,000.00	จ่ายจริง 455,000.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	62065 ●	โครงการขับเคลื่อนแผน แม่บทอวกาศแห่งชาติ	สยศ. / ระวีวรรณ	-	-	-	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	62071 ●	โครงการ Thailand Space Week 2019	สพอ. / ปราณปรียา	2,625,416.20	จ่ายจริง 2,625,416.20 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	62073 ●	โครงการการปรับปรุงสถานที่ ติดตั้ง AIP Center (AIP Data Center) และ ISP (Integrated Singularity Platform)	สผภ. / ตติยะ	5,240,100.00	จ่ายจริง 5,240,100.00 บาท	100.00	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	●	เงินเบิกจ่ายแทนกัน		496,142.96	จ่ายจริง 314,544.20 บาท คงเหลือ 181,598.76 บาท	63.40	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	●	เงินสำรองรายได้		2,975,668.40	จ่ายจริง 2,726,789.15 บาท คงเหลือ 248,879.25 บาท	91.64	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		รวมทั้งหมด		254,599,934.33	จ่ายจริง 228,646,224.58 บาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี 21,947,690.52 บาท คงเหลือ 4,006,019.23 บาท	89.81	97.04	
